



ID	Деятности	Продължителност, дни	Начало, ден	Край, ден	Ресурси	1229 days																																								
						M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40
1	Рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община СВИЛЕНГРАД	1229 days	1	1229		1229 days																																								
2	Техническа рекултивация	149 days	1	149		Техническа рекултивация																																								
3	Откриване на строителната площадка, мобилизация и организация на временното състояние	3 days	1	3		149 days																																								
4	Подготвителни работи, организация на лабораторен контрол и създаване на геодезична опорна мрежа	2 days	4	5																																										
5	Почистване, прибиране и предпониране на битови отпадъци от частни имоти	16 days	8	23	Багер [2]; Самосвал [6]; Булдозер [2]; Работници [2]	Багер [2]; Самосвал [6]; Булдозер [2]; Работници [2]																																								
6	Вертикална планировка и оформяне тялото на депо	51 days	24	74	Багер [4]; Самосвал [12]; Булдозер [2]	Багер [4]; Самосвал [12]; Булдозер [2]																																								
7	Изграждане на опорна призма около границите на протоксираното тяло на депо	16 days	75	90	Багер [2]; Самосвал [6]; Булдозер [2]; Валяк [3]	Багер [2]; Самосвал [6]; Булдозер [2]; Валяк [3]																																								
8	Необлицована канавка за повърхностни води, вкл. тръби Ø200 за дренаж	10 days	91	100	Багер ; Булдозер ; Работници [6]	Багер ; Булдозер ; Работници [6]																																								
9	Изравнителен земен слой 0.2 м	6 days	75	80	Багер [2]; Самосвал [4]; Булдозер	Багер [2]; Самосвал [4]; Булдозер																																								
10	Газоулавяща и газоотвеждаща система, газоотвеждащи кладенци 3 бр. и слой чакъл	17 days	81	97	Багер [2]; Валяк ; Работници [6]; Самосвал	Багер [2]; Валяк ; Работници [6]; Самосвал																																								
11	Подаване на бетонитова мембрана, Eurobent 3500L	45 days	92	136	Багер ; Работници [6]	Багер ; Работници [6]																																								
12	Подаване на дренажен слой за повърхностни води	14 days	127	140	Самосвал [5]; Булдозер [2]	Самосвал [5]; Булдозер [2]																																								
13	Изграждане на рекултивационни пластове от земни почви /похумусен слой и хумус/	22 days	127	148	Багер [2]; Самосвал [4]; Булдозер	Багер [2]; Самосвал [4]; Булдозер																																								
14	Изграждане на мониторингови репери	9 days	138	146	Работници [2]	Работници [2]																																								
15	Приемане на техническата рекултивация съгласно Раздел V от НАРЕДБА № 26 от 2.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оплодотворяване на хумусни пластове издаване на акт образец 15.	1 day	149	149																																										
16	Биологична рекултивация	1080 days	150	1229		Биологична рекултивация																																								
17	Затревяване	1080 days	150	1229		1080 days																																								
18	1-ва година - подравняване, торене, засяване	30 days	150	179	Водоносна ; Окомплектован трактор ; Работници [6]	Водоносна ; Окомплектован трактор ; Работници [6]																																								
19	1-ва година - внасяне на останало количество торове	7 days	310	316	Водоносна ; Окомплектован трактор ; Работници [6]	Водоносна ; Окомплектован трактор ; Работници [6]																																								
20	1-ва година - косене	10 days	352	361	Косачки [4]; Работници [6]	Косачки [4]; Работници [6]																																								
21	1-ва година - поливане	126 days	364	489	Водоносна [2]	Водоносна [2]																																								
27	2-ра година - торене	20 days	701	742	Водоносна ; Окомплектован трактор ; Работници [6]	Водоносна ; Окомплектован трактор ; Работници [6]																																								
28	2-ра година - косене	126 days	729	854	Косачки [4]; Работници [6]	Косачки [4]; Работници [6]																																								
34	3-та година - торене	20 days	1067	1108	Водоносна ; Окомплектован трактор ; Работници [6]	Водоносна ; Окомплектован трактор ; Работници [6]																																								
35	3-та година - косене	124 days	1105	1229	Косачки [4]; Работници [6]	Косачки [4]; Работници [6]																																								
41	Засаждане на дървесна и храстова растителност	1080 days	150	1229		1080 days																																								
42	1-ва година - Почвоподготовка	30 days	150	179	Водоносна ; Окомплектован трактор ; Работници [6]	Водоносна ; Окомплектован трактор ; Работници [6]																																								
43	1-ва година - Основно торене с фосфорен и азотен тор	30 days	150	179	Водоносна ; Окомплектован трактор ; Работници [6]	Водоносна ; Окомплектован трактор ; Работници [6]																																								
44	1-ва година - Маркиране на посадните места	30 days	310	339	Работници [6]	Работници [6]																																								
45	1-ва година - Засаждане на фиданките	30 days	310	339	Работници [6]	Работници [6]																																								
46	1-ва година - Подхранване с минерални торове	10 days	340	349	Водоносна ; Окомплектован трактор ; Работници [6]	Водоносна ; Окомплектован трактор ; Работници [6]																																								
47	1-ва година - Окопаване на младите фиданки	75 days	350	424	Работници [6]	Работници [6]																																								
48	1-ва година - Подхранване с минерални торове (есента)	10 days	515	524	Водоносна ; Окомплектован трактор ; Работници [6]	Водоносна ; Окомплектован трактор ; Работници [6]																																								
49	2-ра година - попълване на местата на загинали фиданки	10 days	675	684	Работници [6]	Работници [6]																																								
50	2-ра година - торене с минерални торове	4 days	685	688	Окомплектован трактор ; Работници [4]	Окомплектован трактор ; Работници [4]																																								
51	2-ра година - окопаване	20 days	715	765	Окомплектован трактор ; Работници [4]	Окомплектован трактор ; Работници [4]																																								
52	3-та година - торене с минерални торове	10 days	1220	1229	Окомплектован трактор ; Работници [4]	Окомплектован трактор ; Работници [4]																																								
53	3-та година - попълване на местата на загинали фиданки	10 days	1045	1054	Работници [6]	Работници [6]																																								
54	3-та година - подхранване с минерални торове	10 days	1055	1064	Окомплектован трактор ; Работници [4]	Окомплектован трактор ; Работници [4]																																								
55	3-та година - окопаване	10 days	1055	1064	Окомплектован трактор ; Работници [4]	Окомплектован трактор ; Работници [4]																																								

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

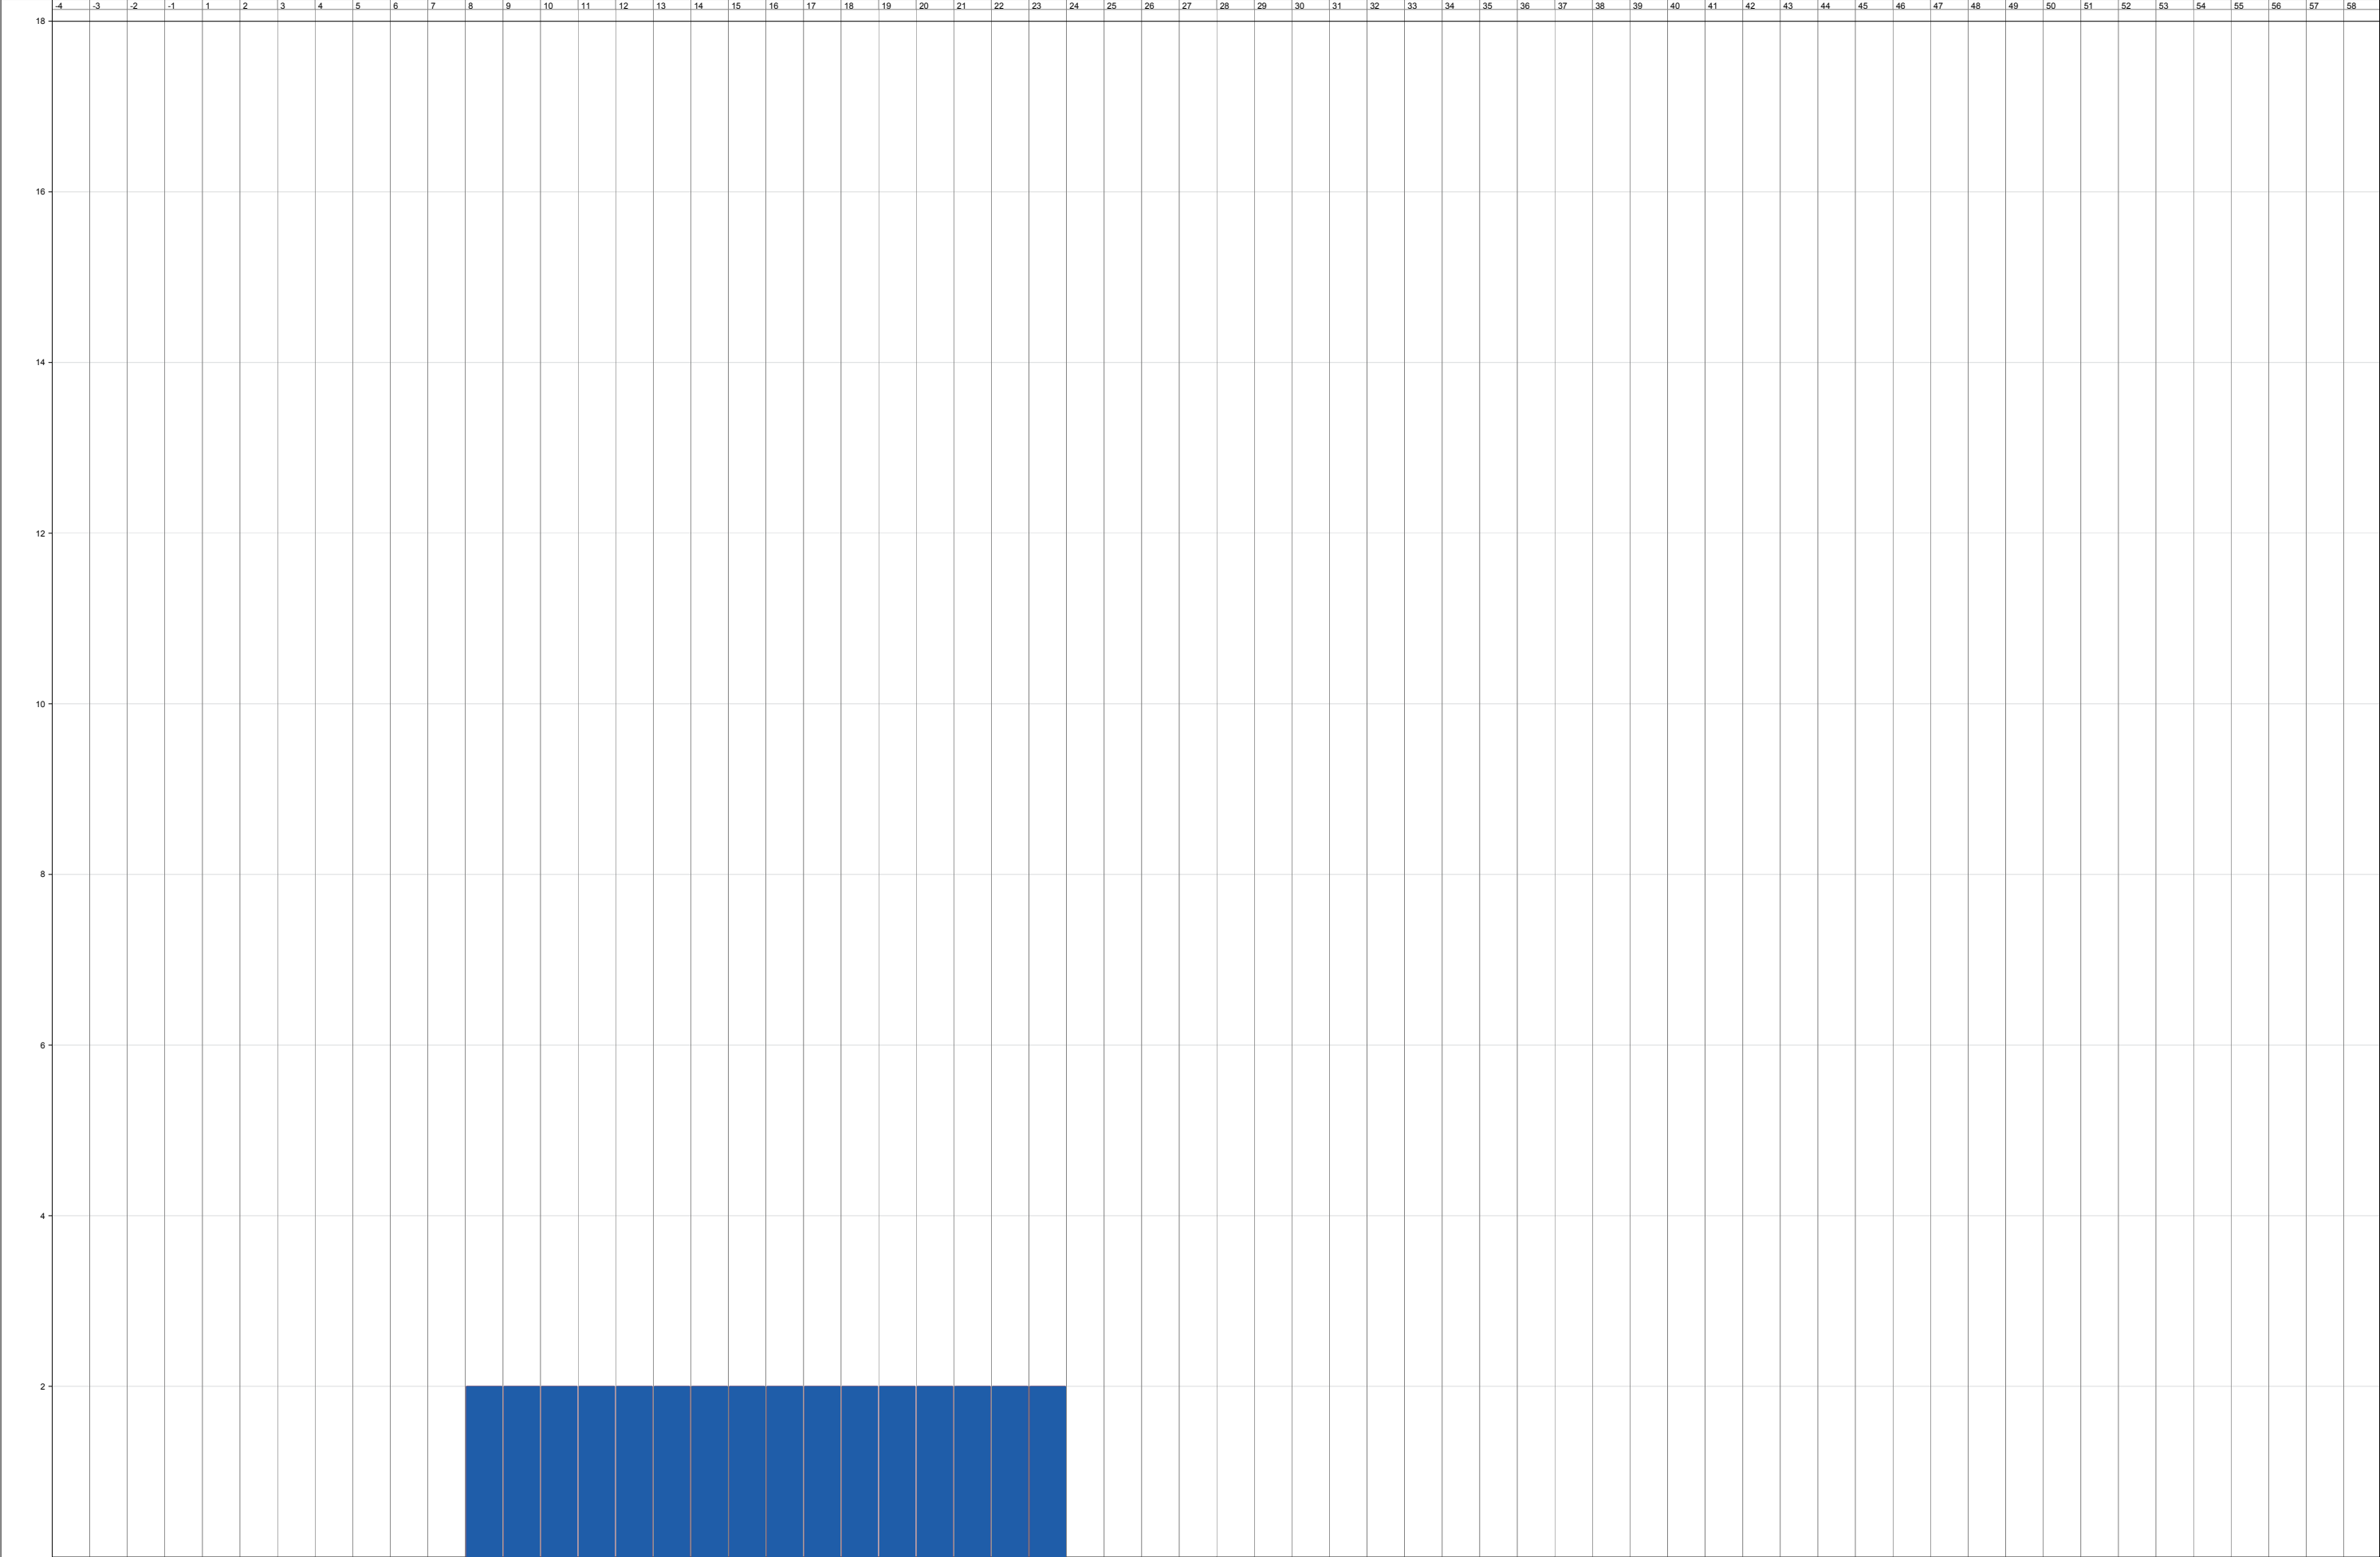


Peak Units: Работници Overallocated: █ Allocated: █

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

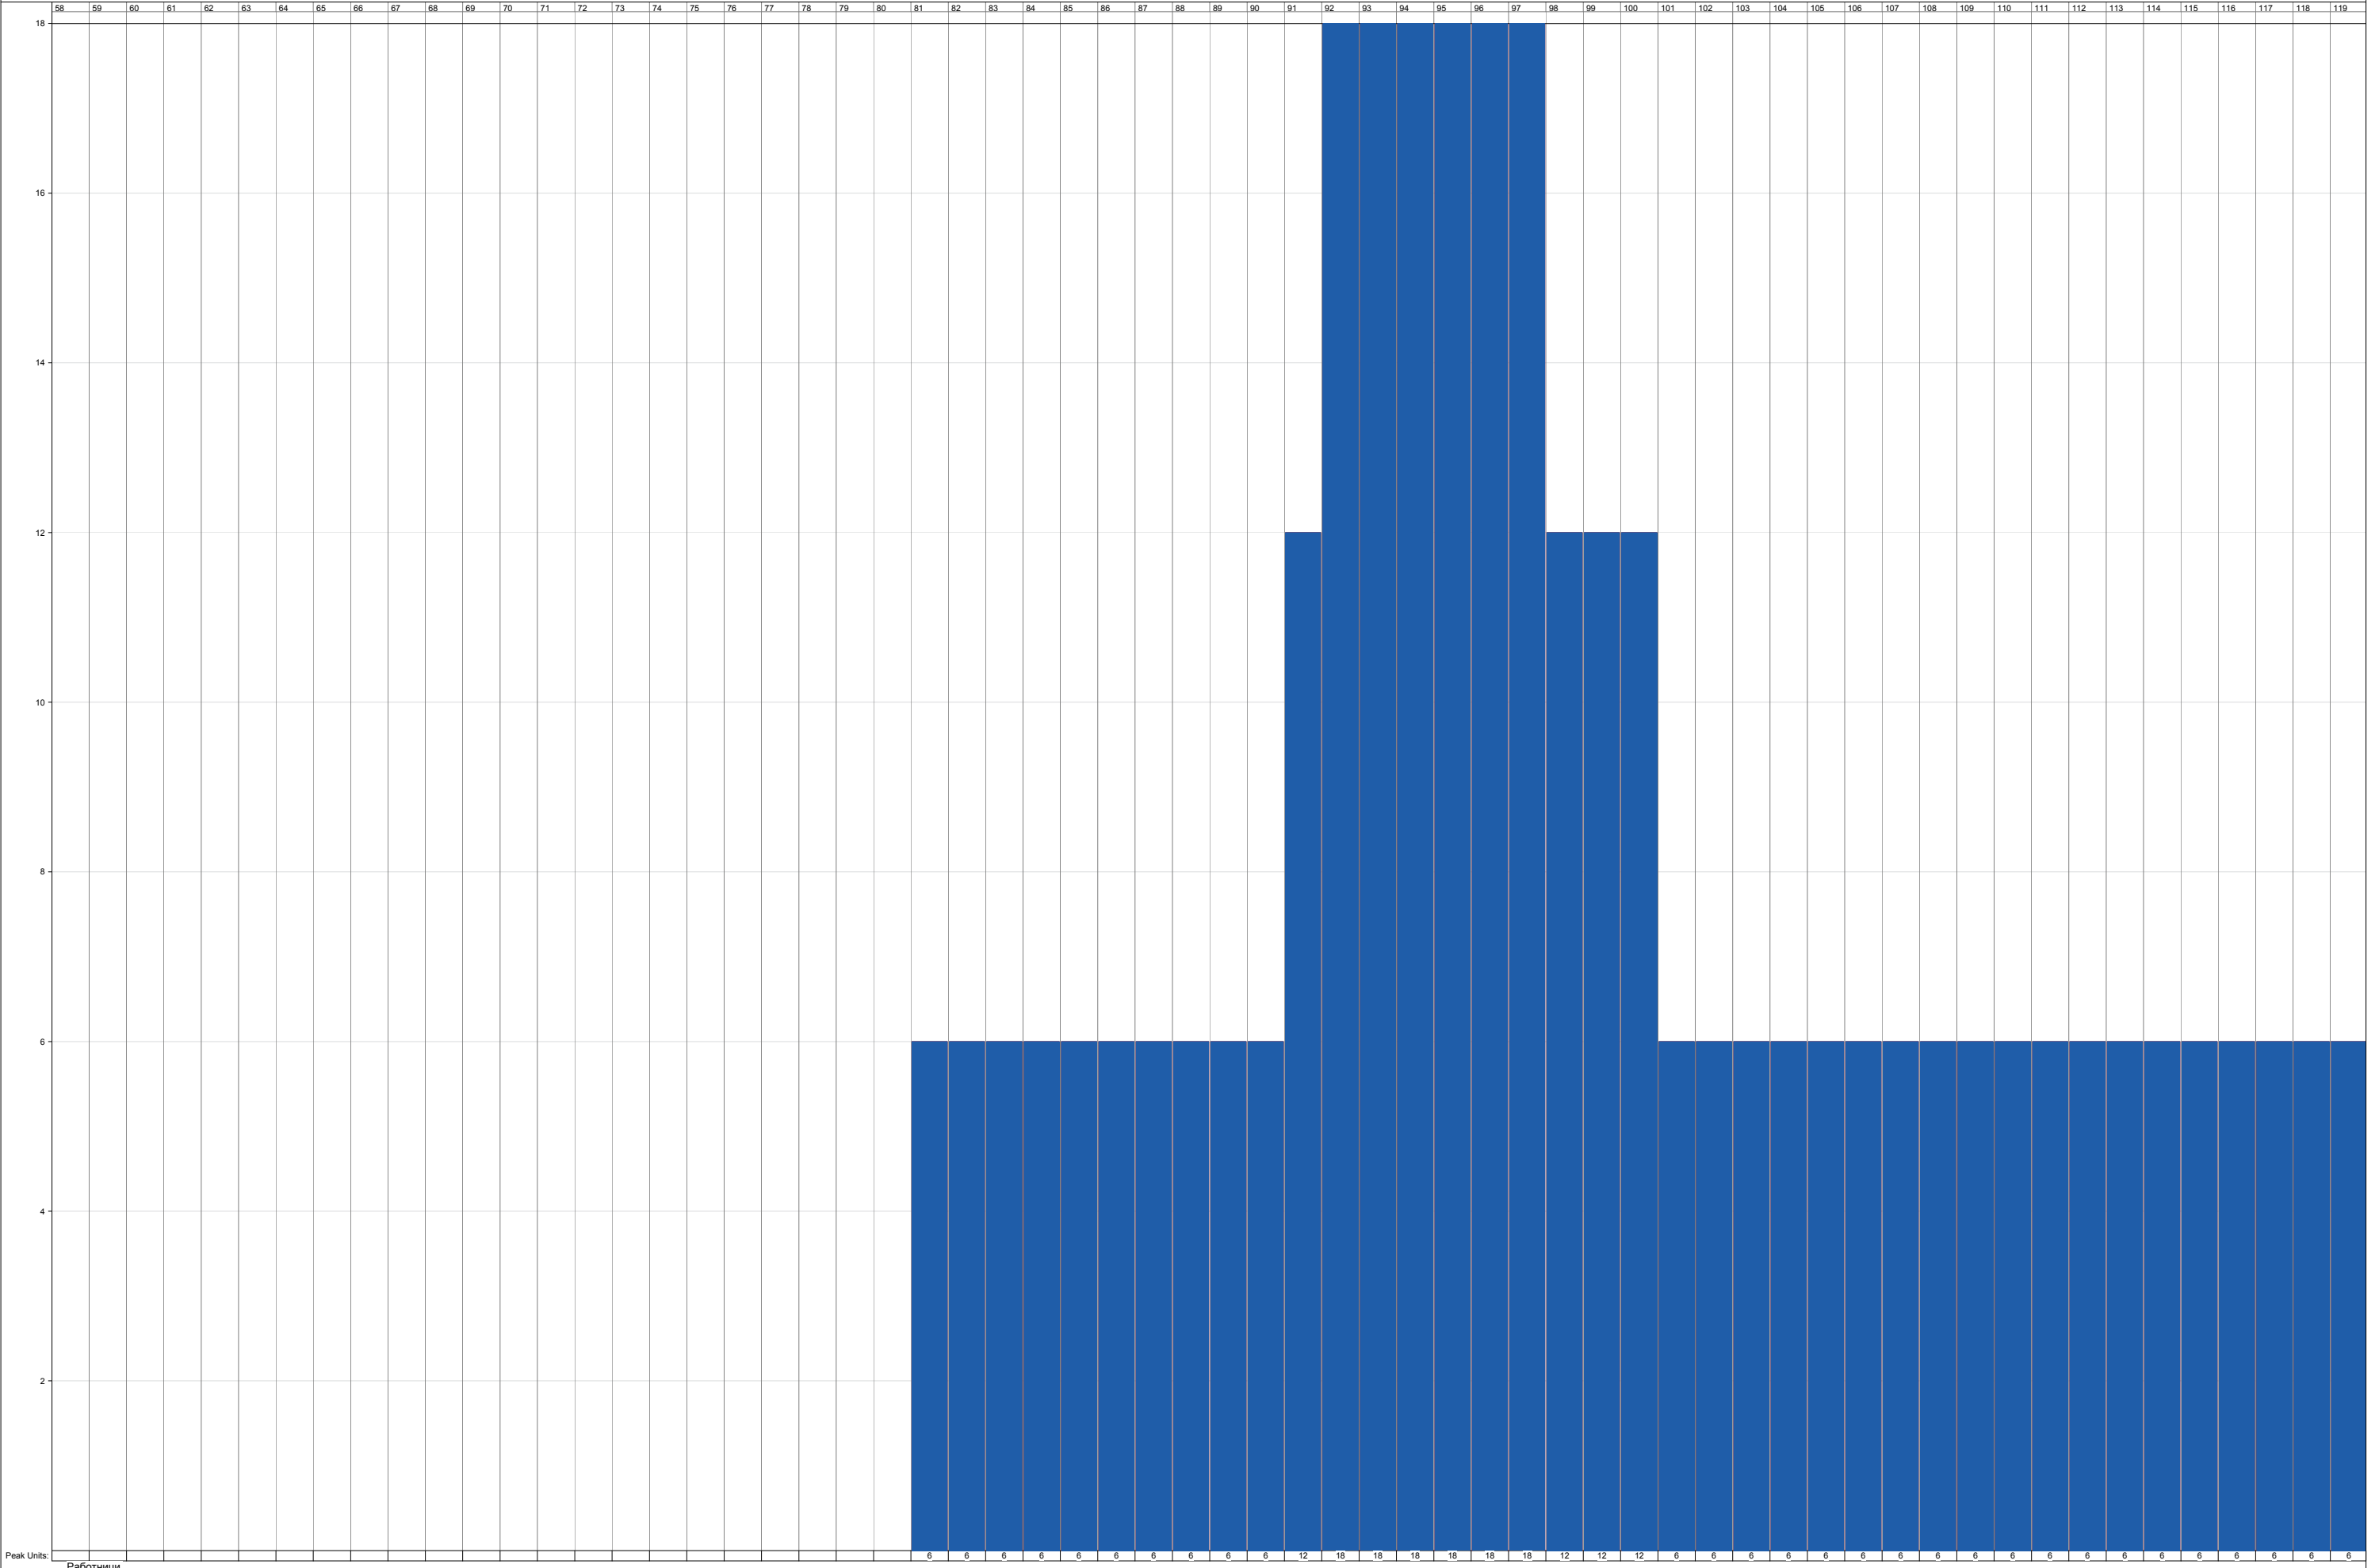


Peak Units: Работници
 Overallocated: █ Allocated: █

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

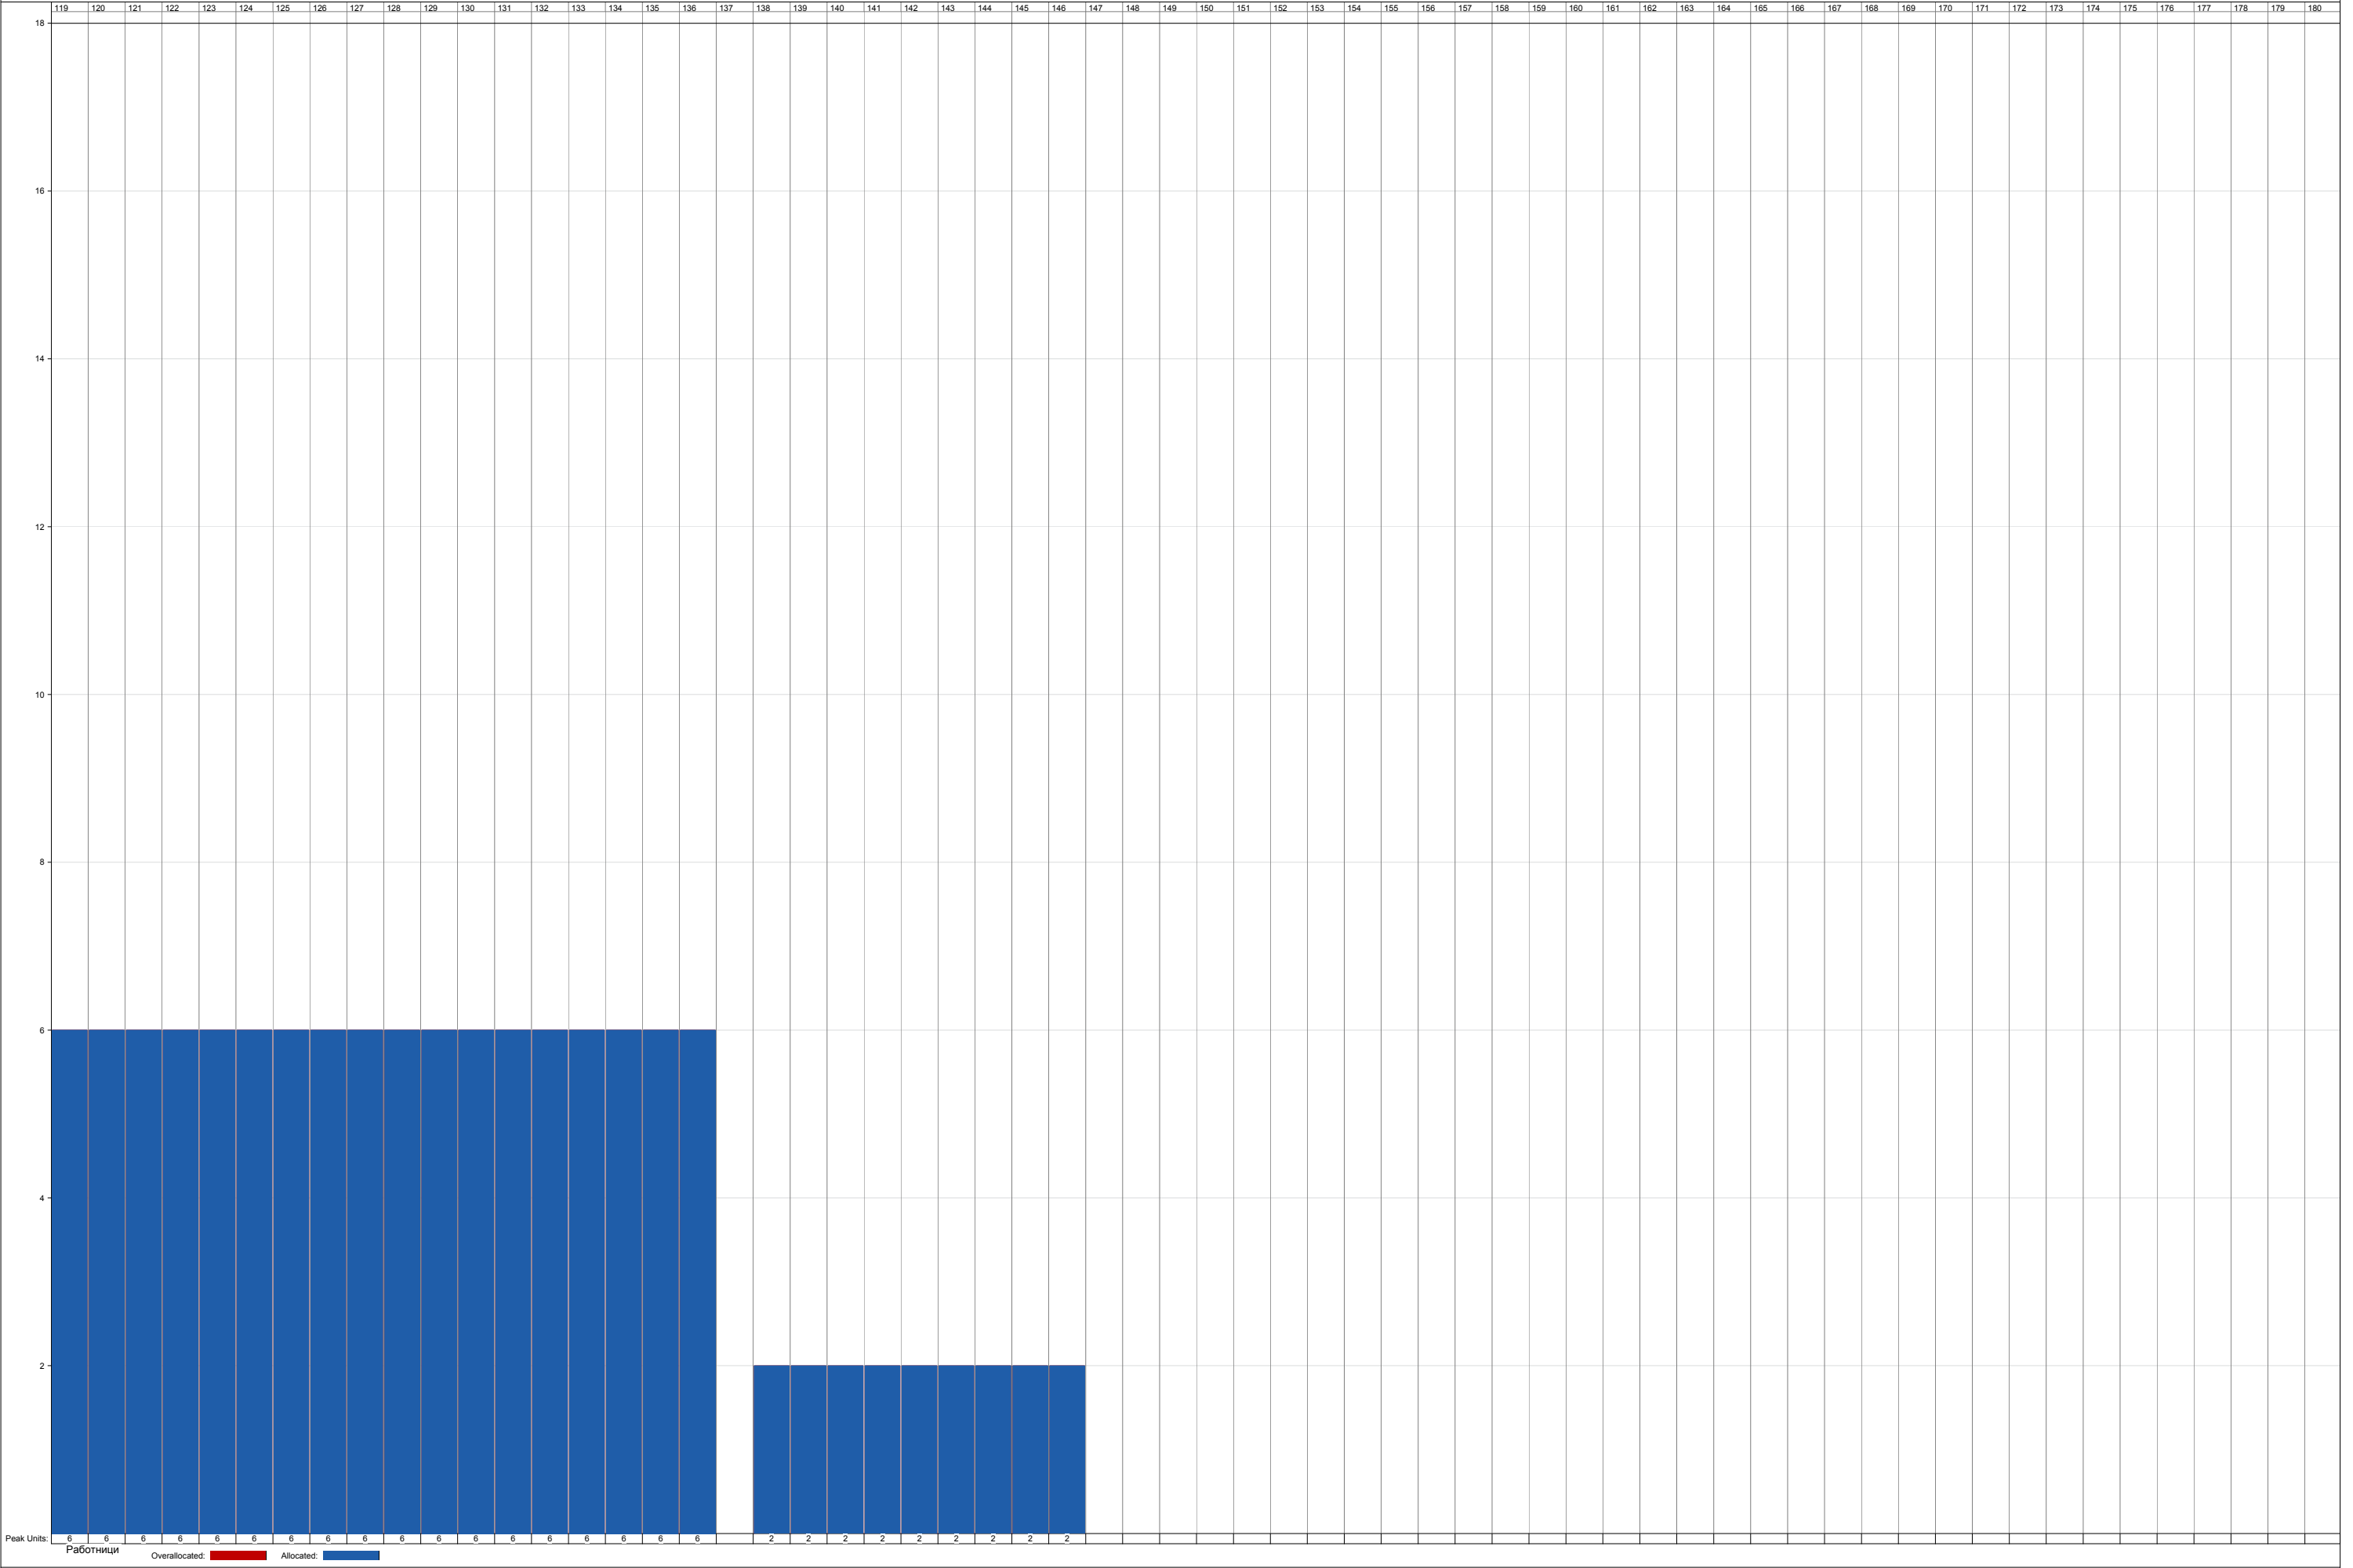


Peak Units: Работници
Overallocated: █ Allocated: █

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

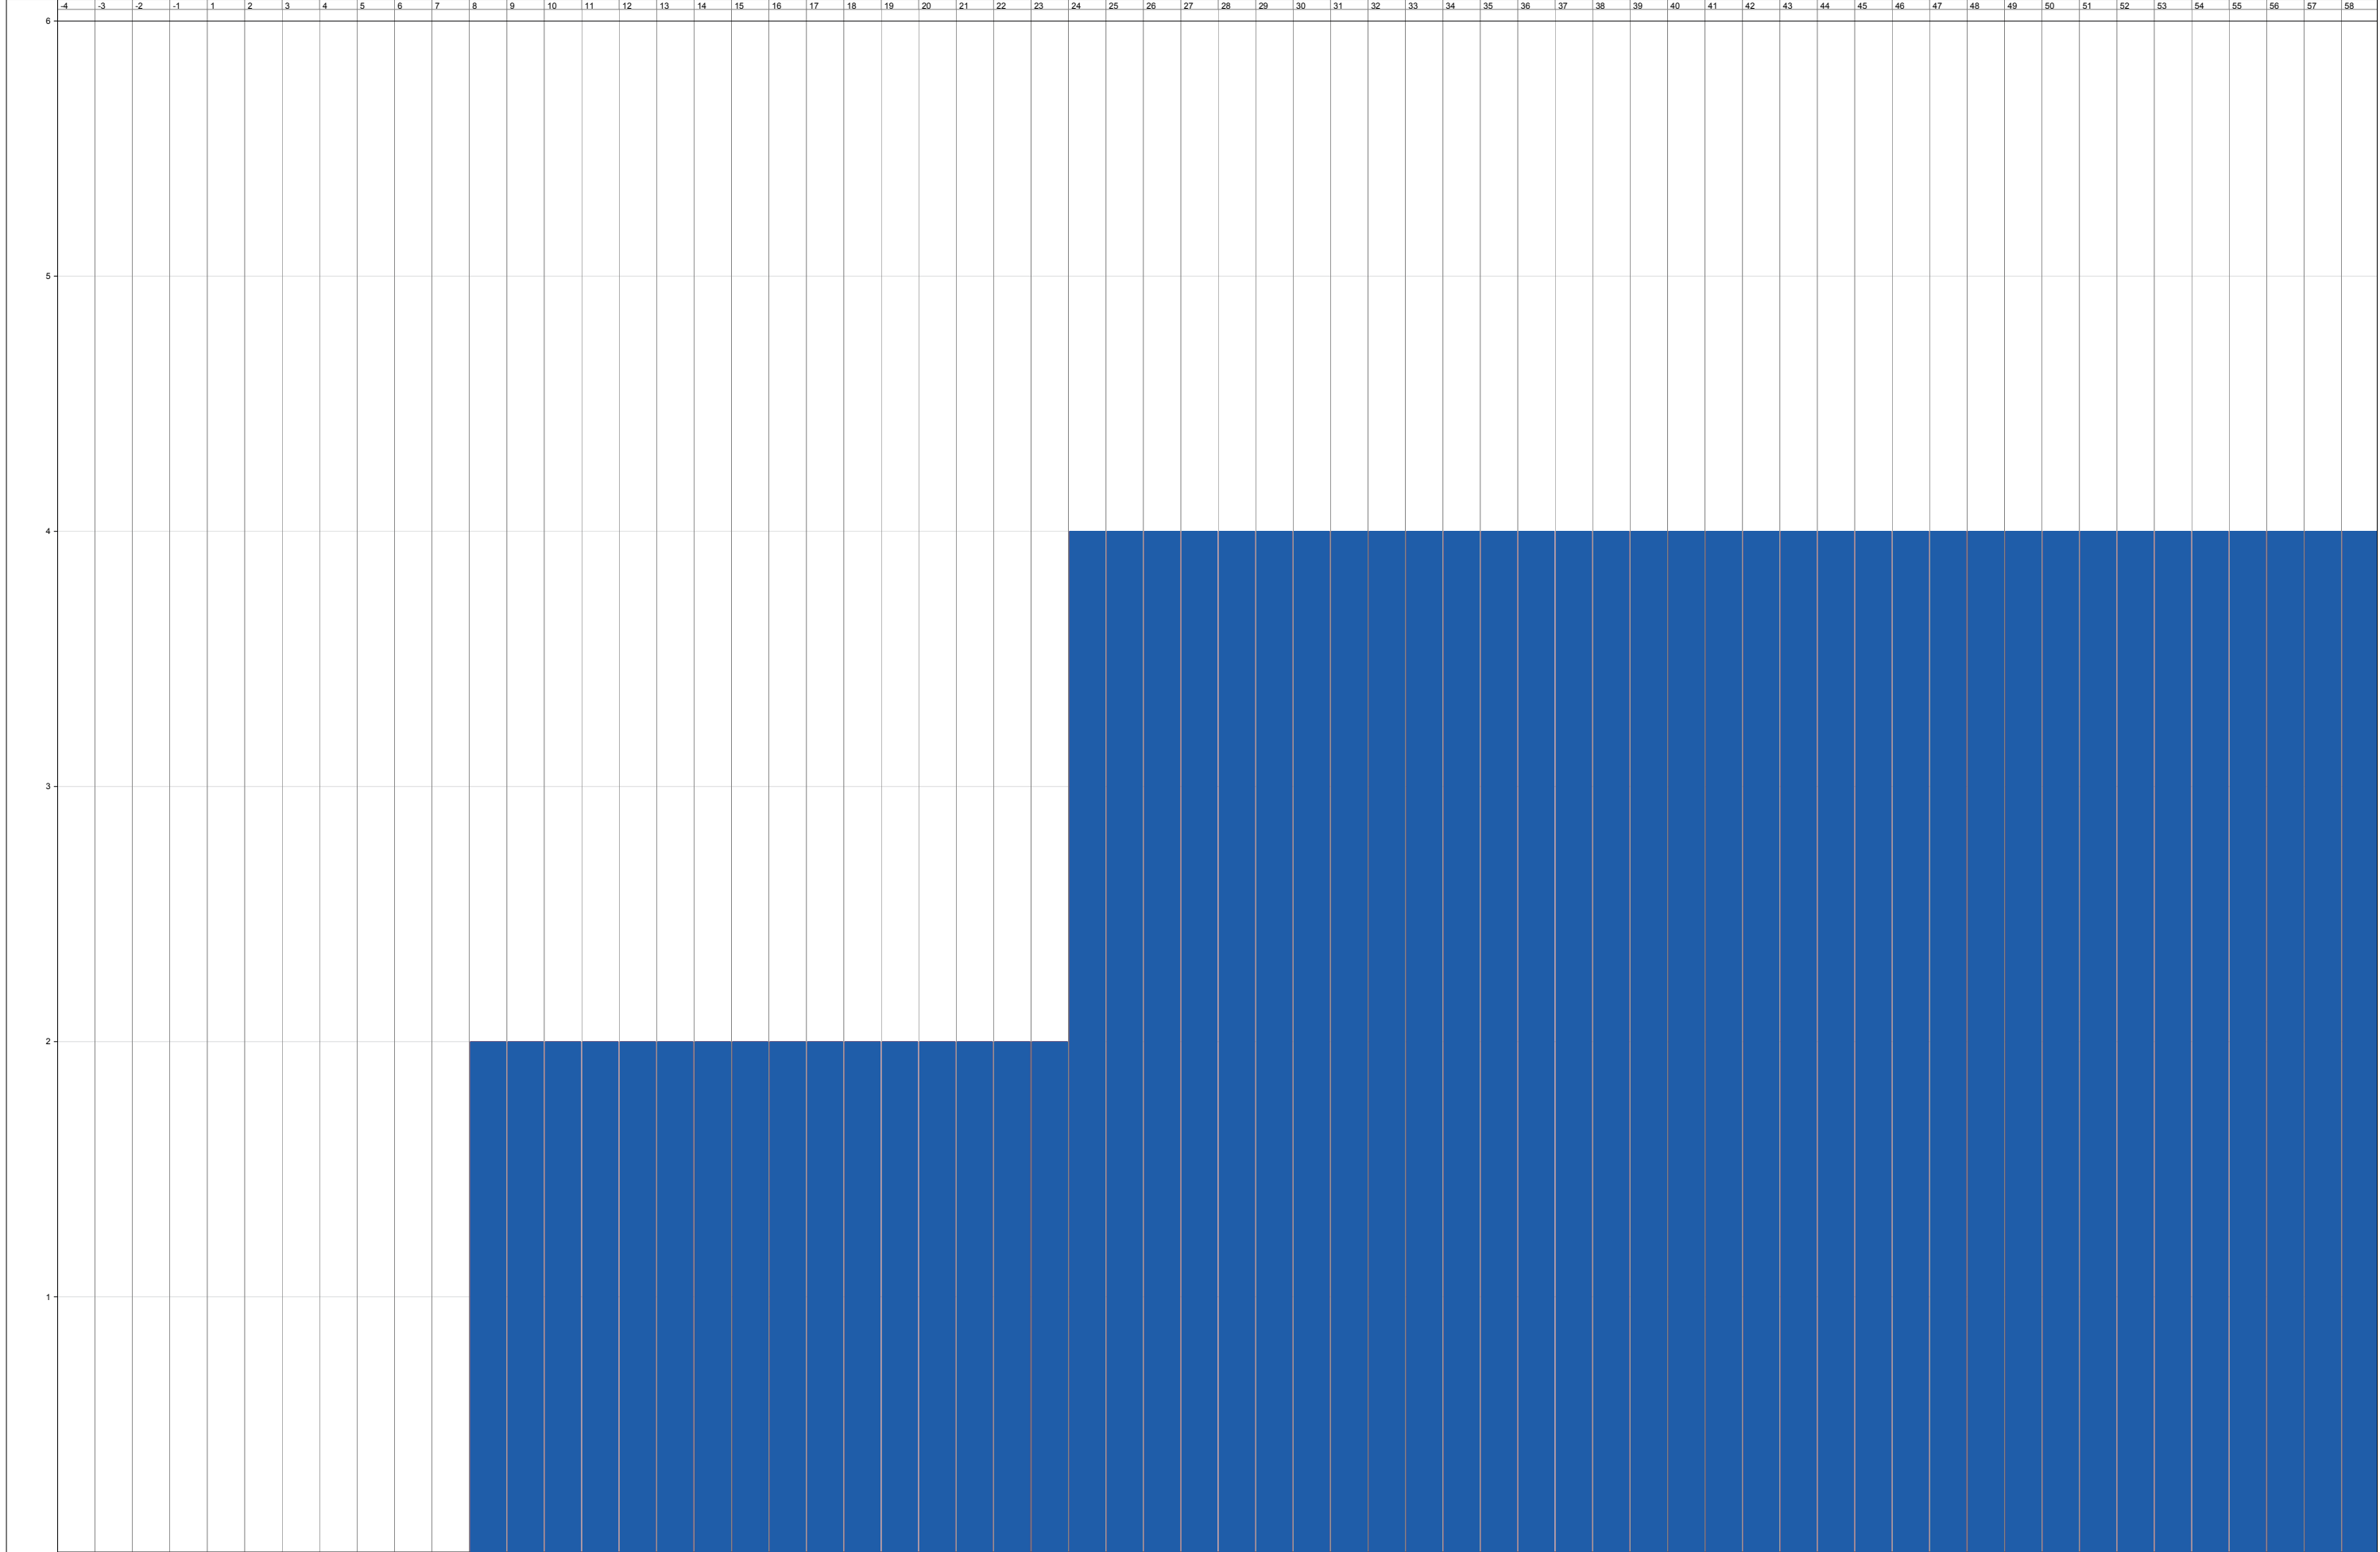


Peak Units: Базен Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

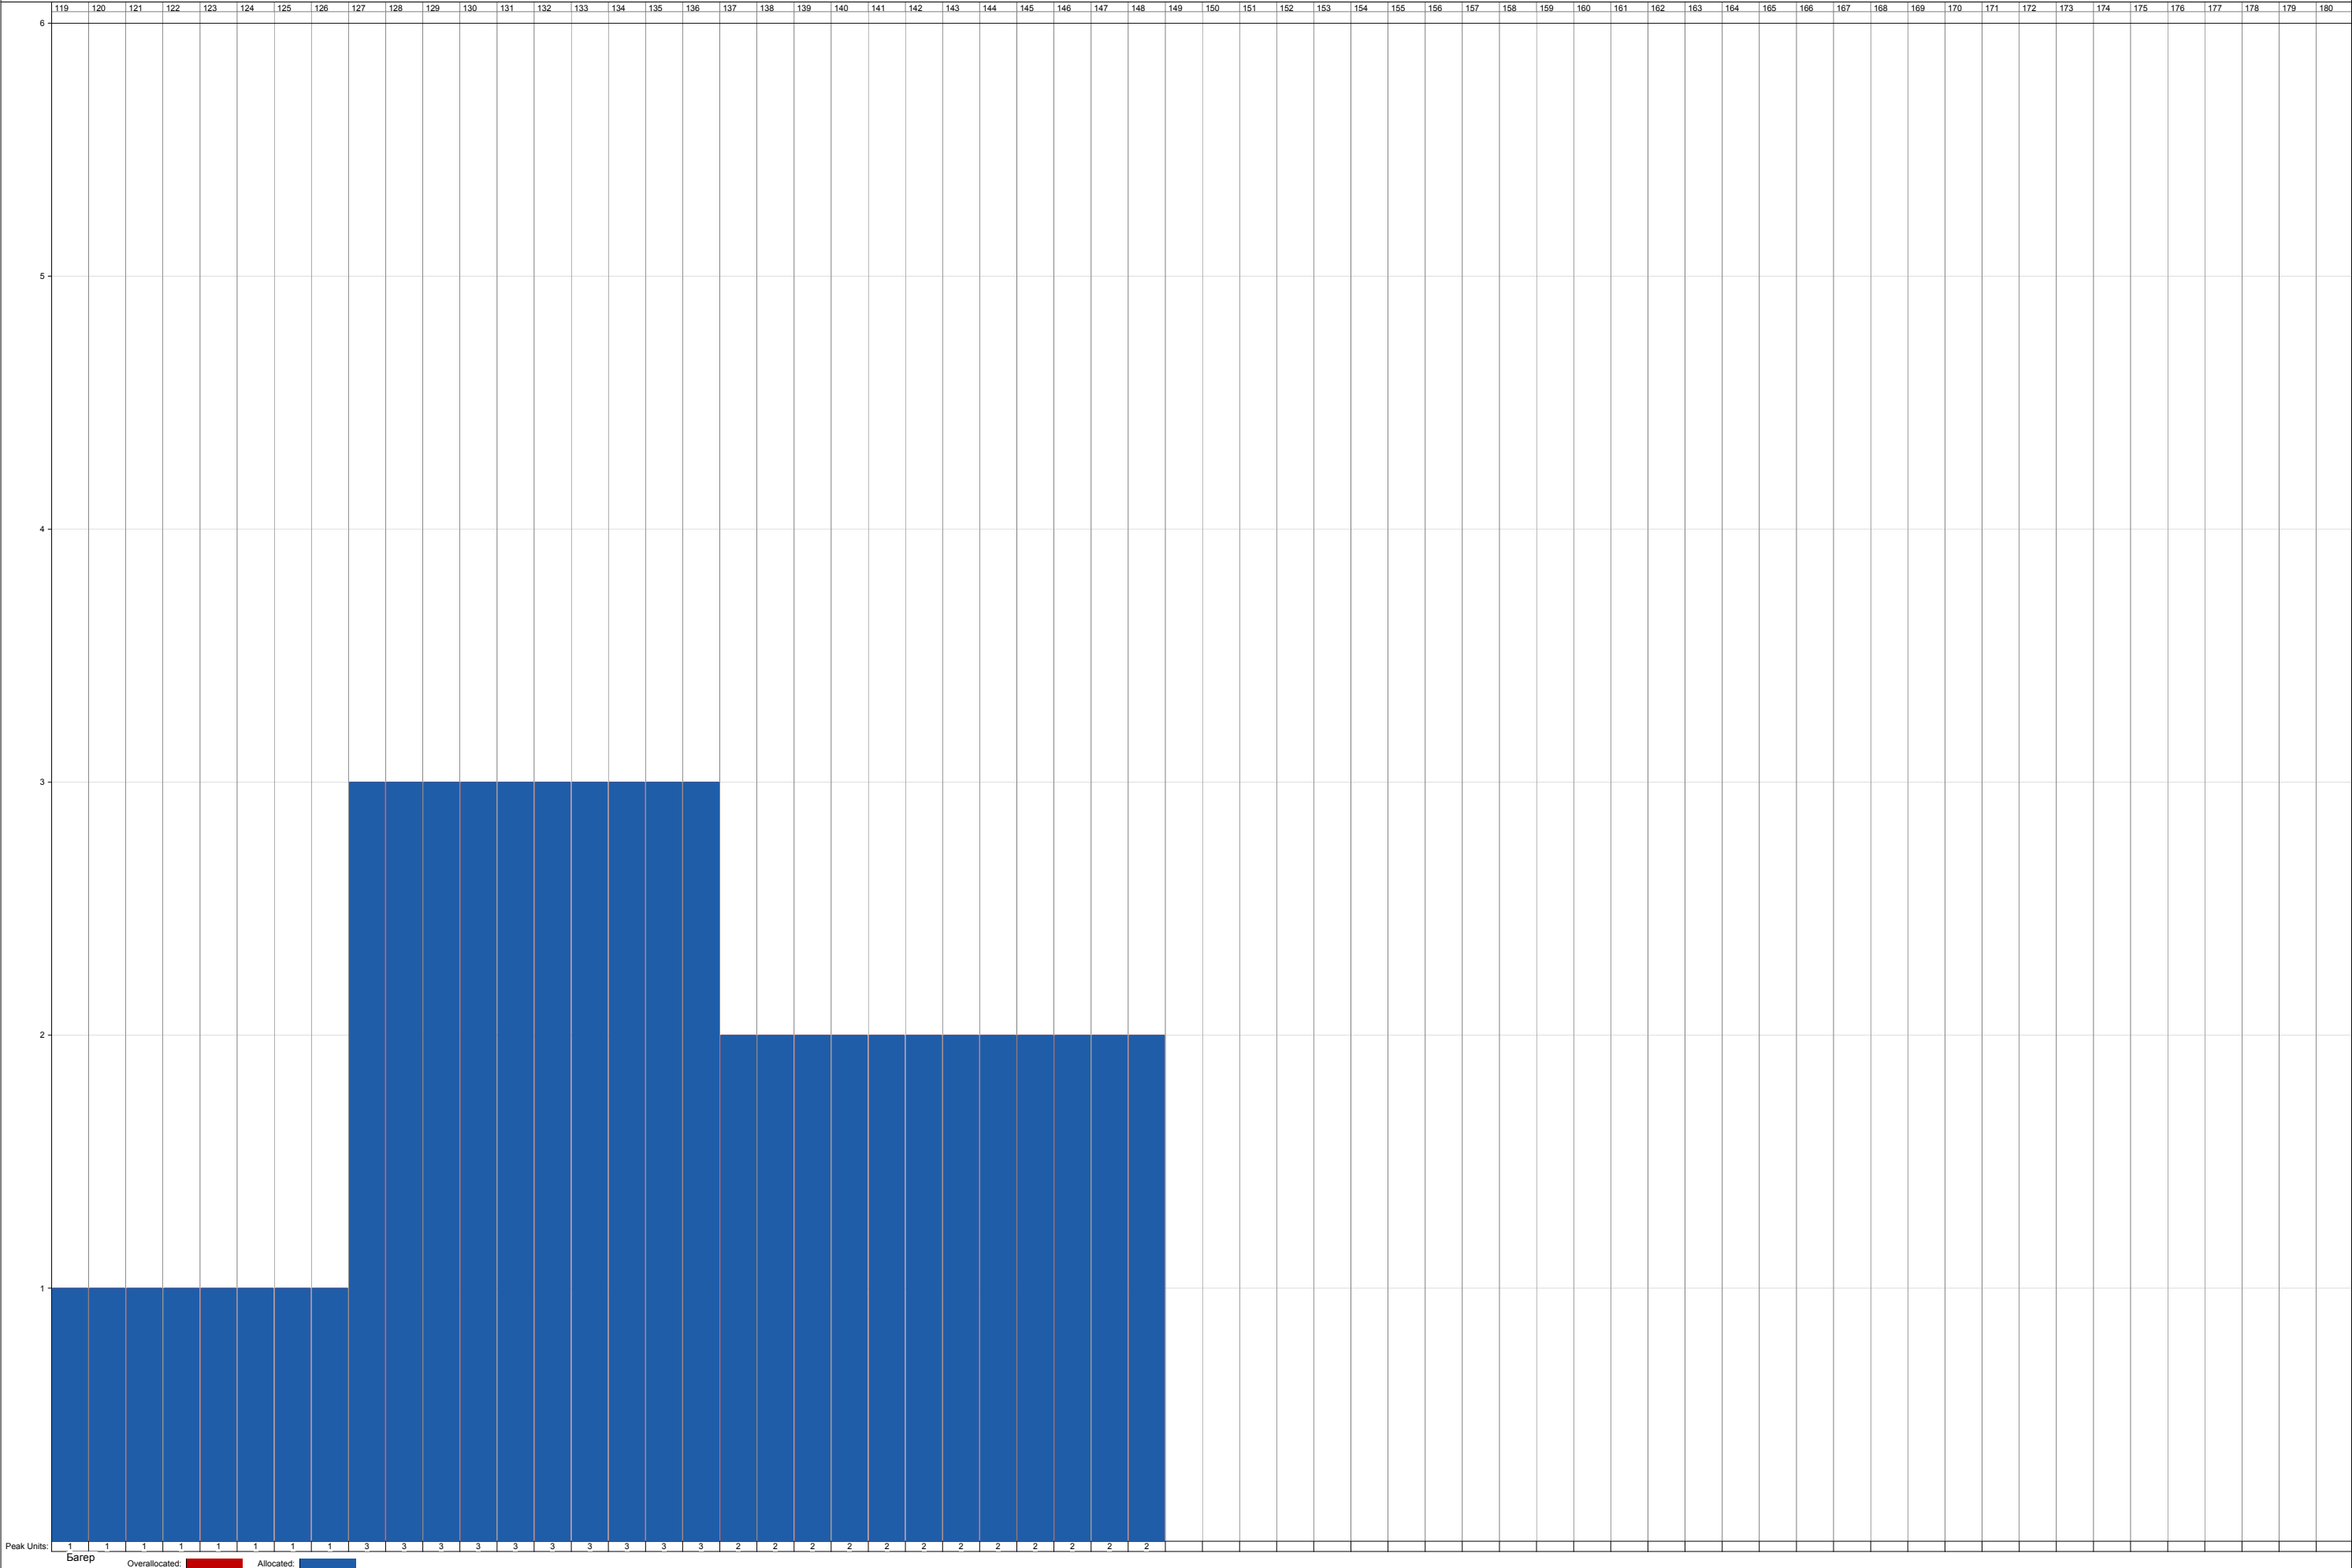


Peak Units: 1 2 3 4 5 6
 Бяреп Overallocated: █ Allocated: █

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

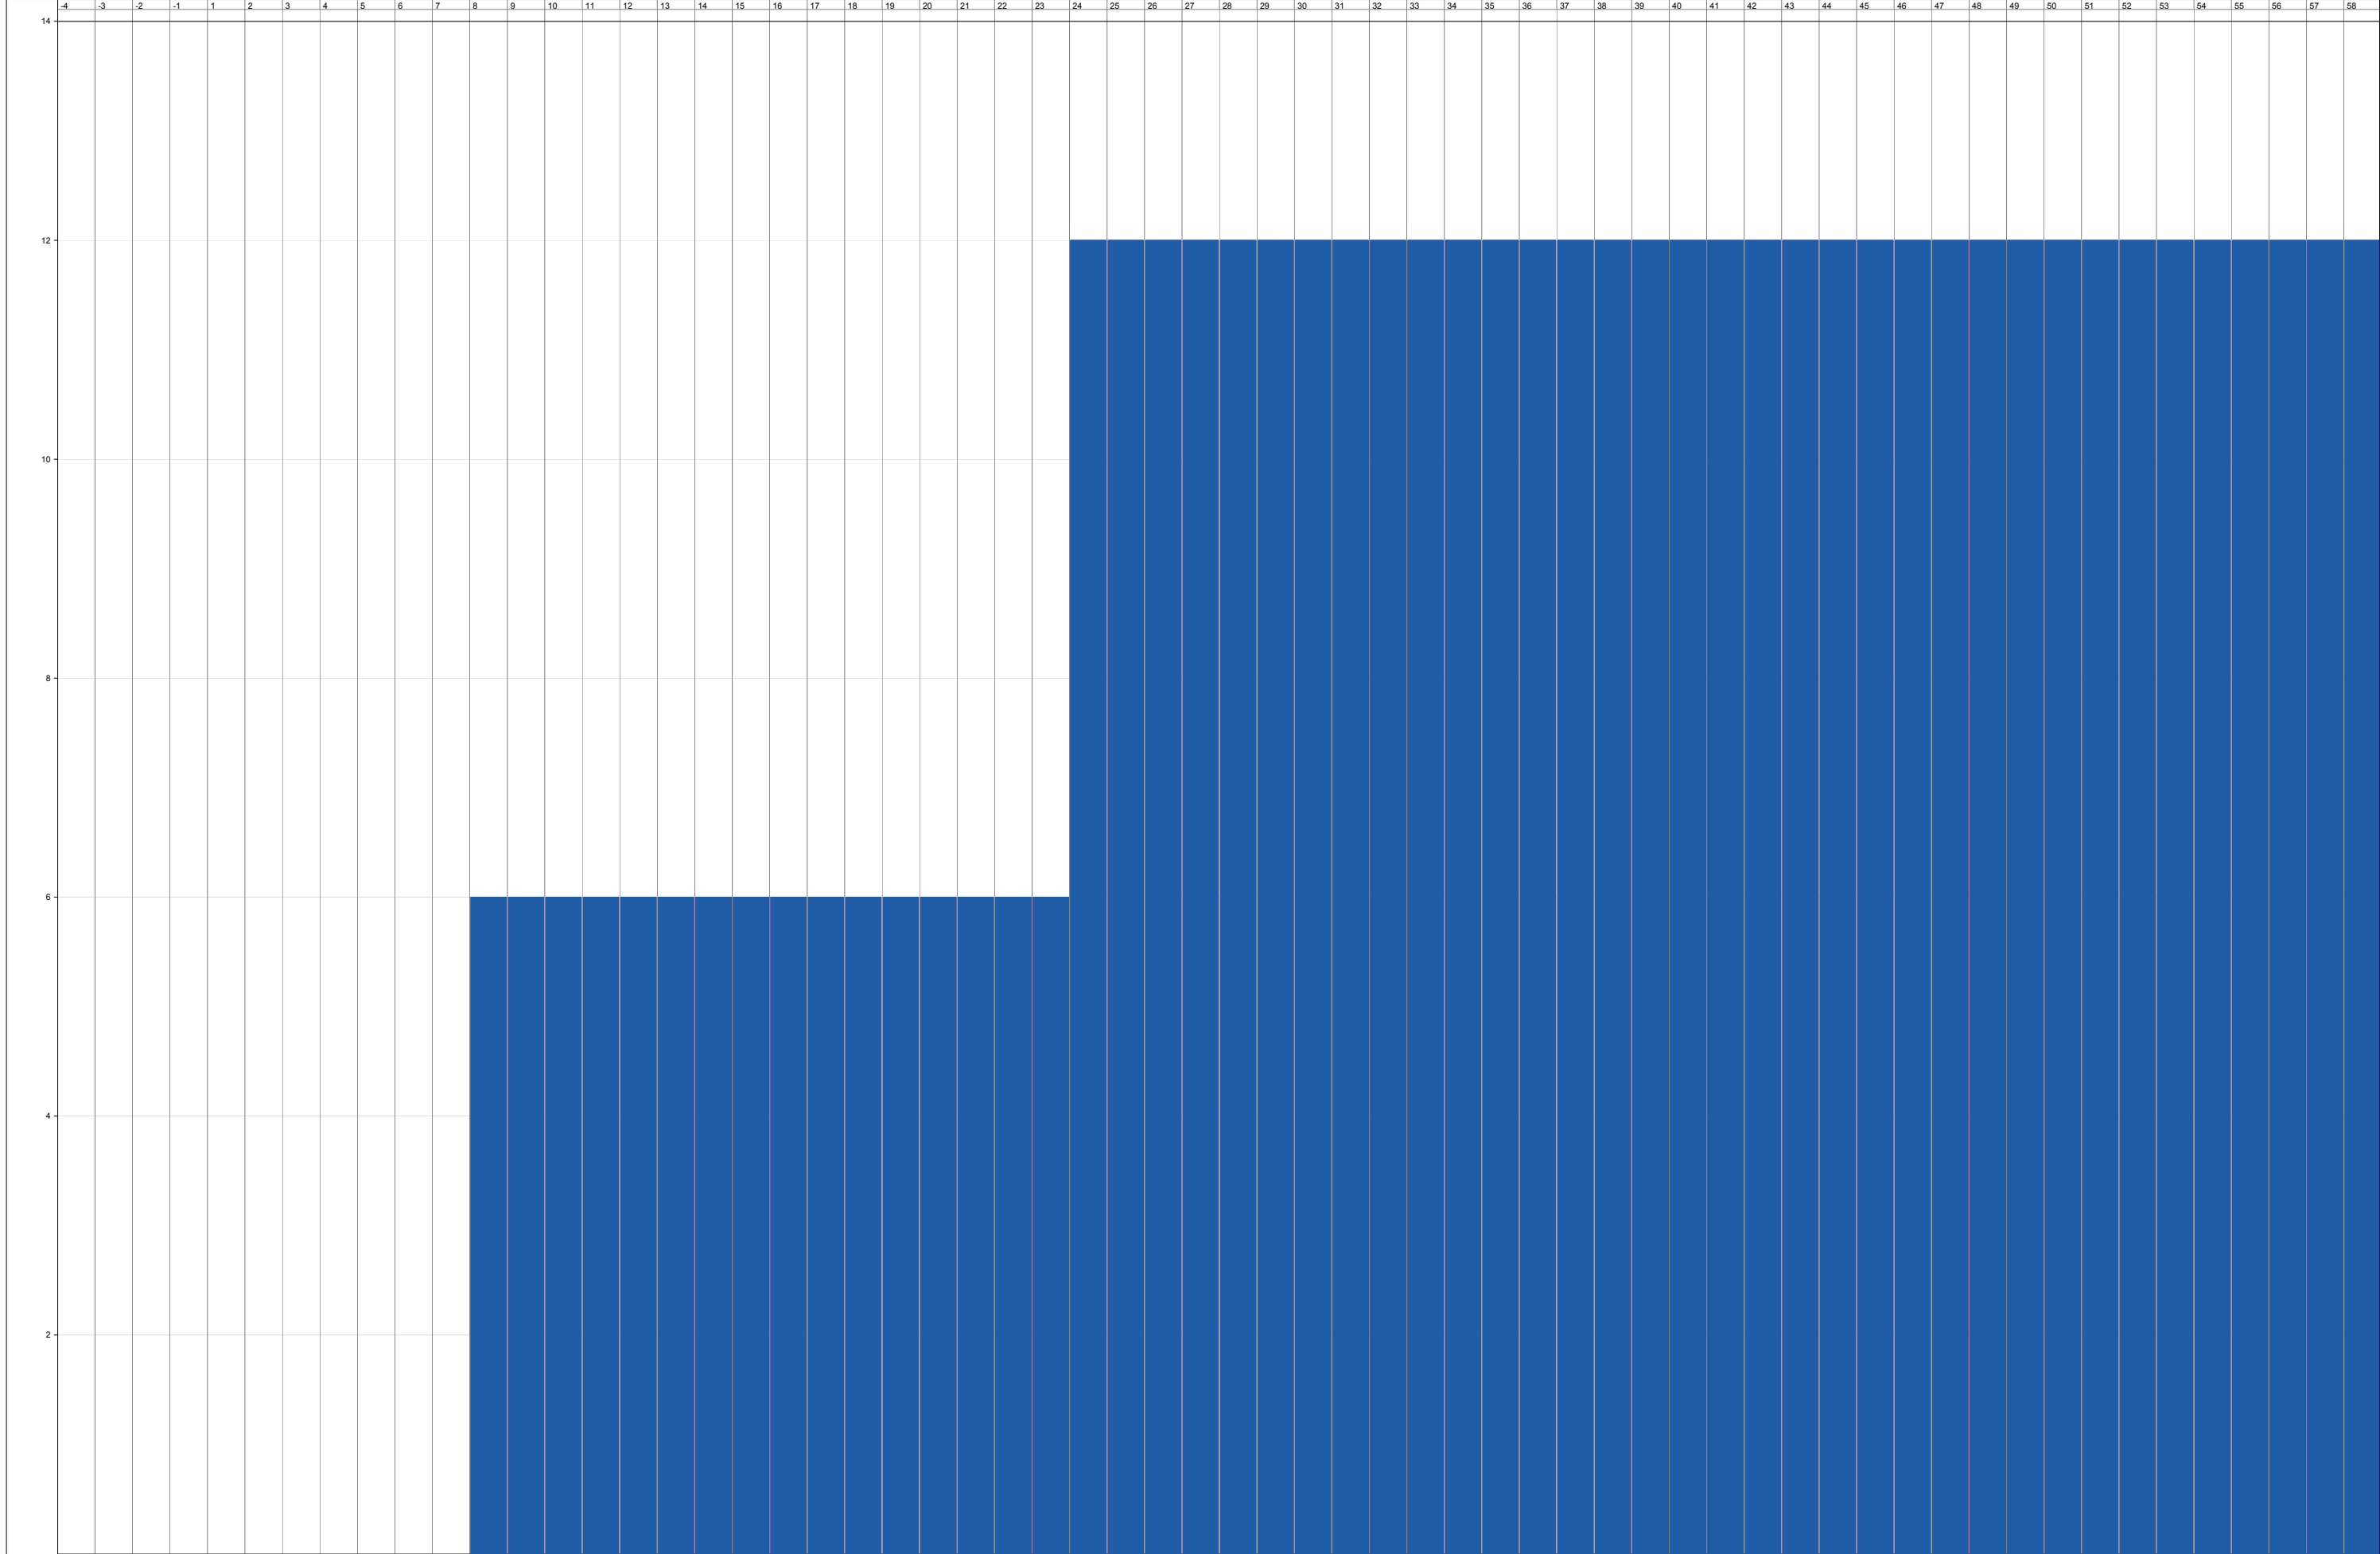


Peak Units: Самосвал Overallocated: █ Allocated: █

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

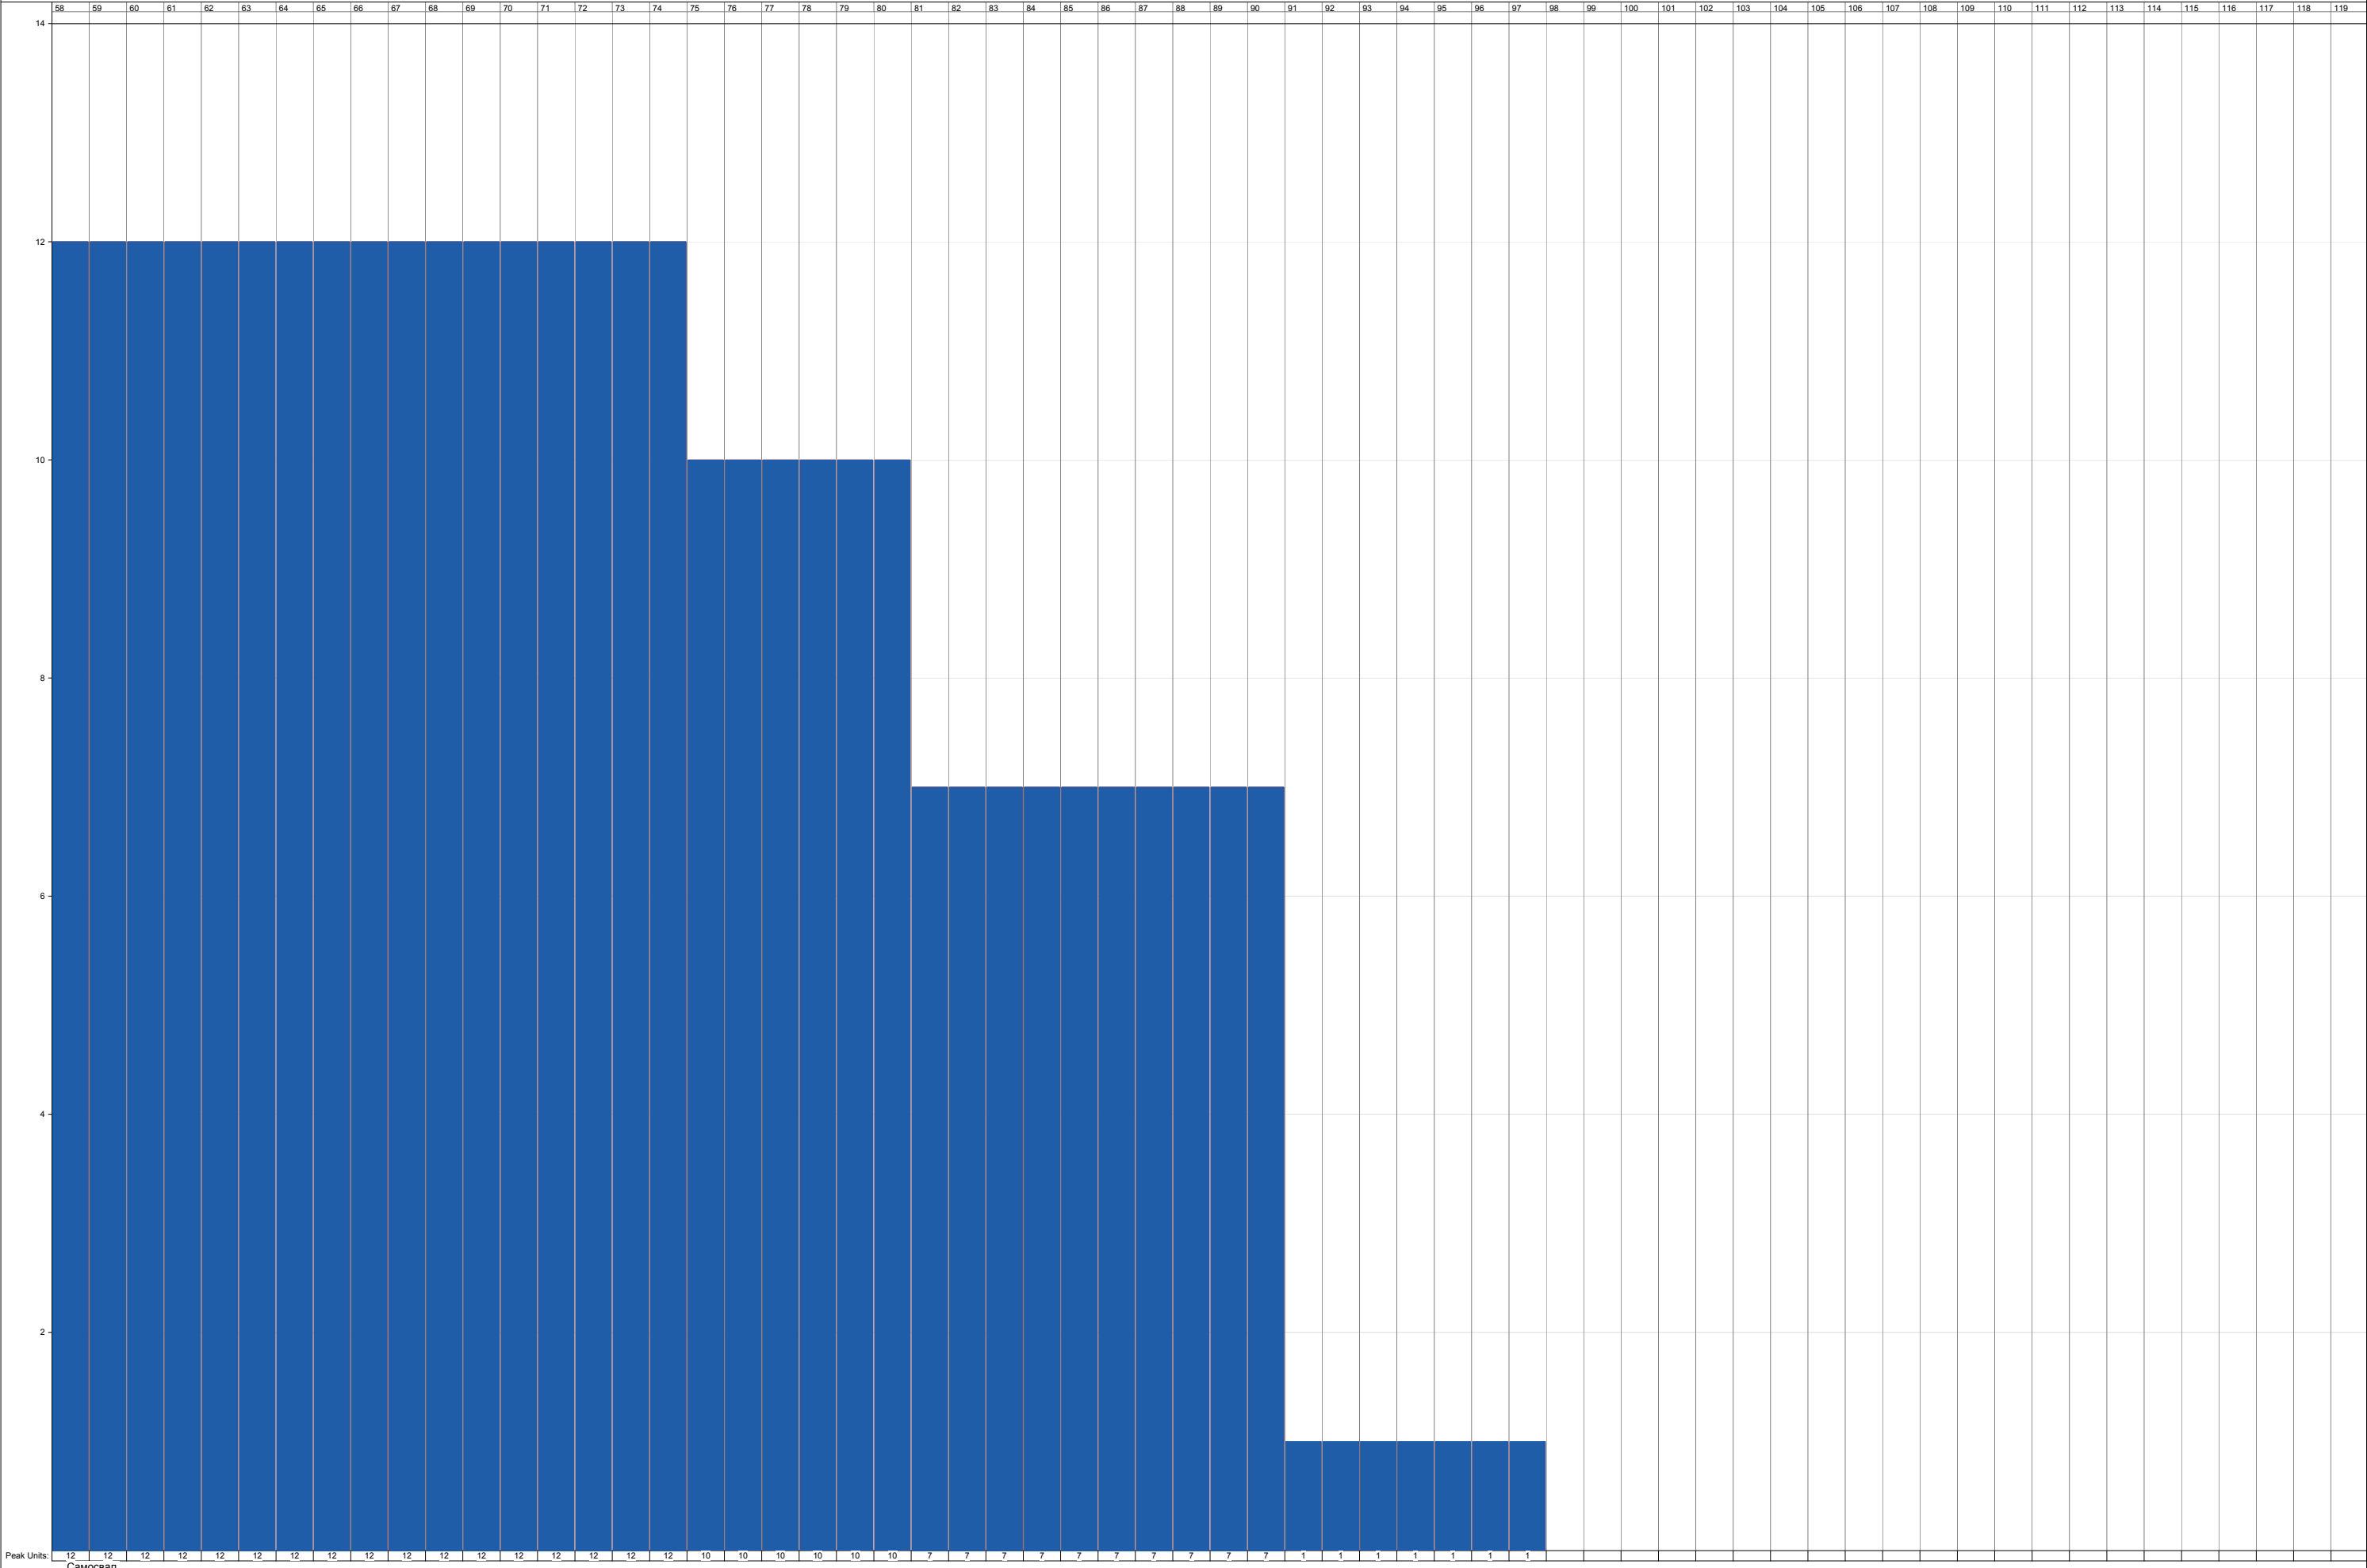


Peak Units: Самосвал
 Overallocated: █ Allocated: █

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

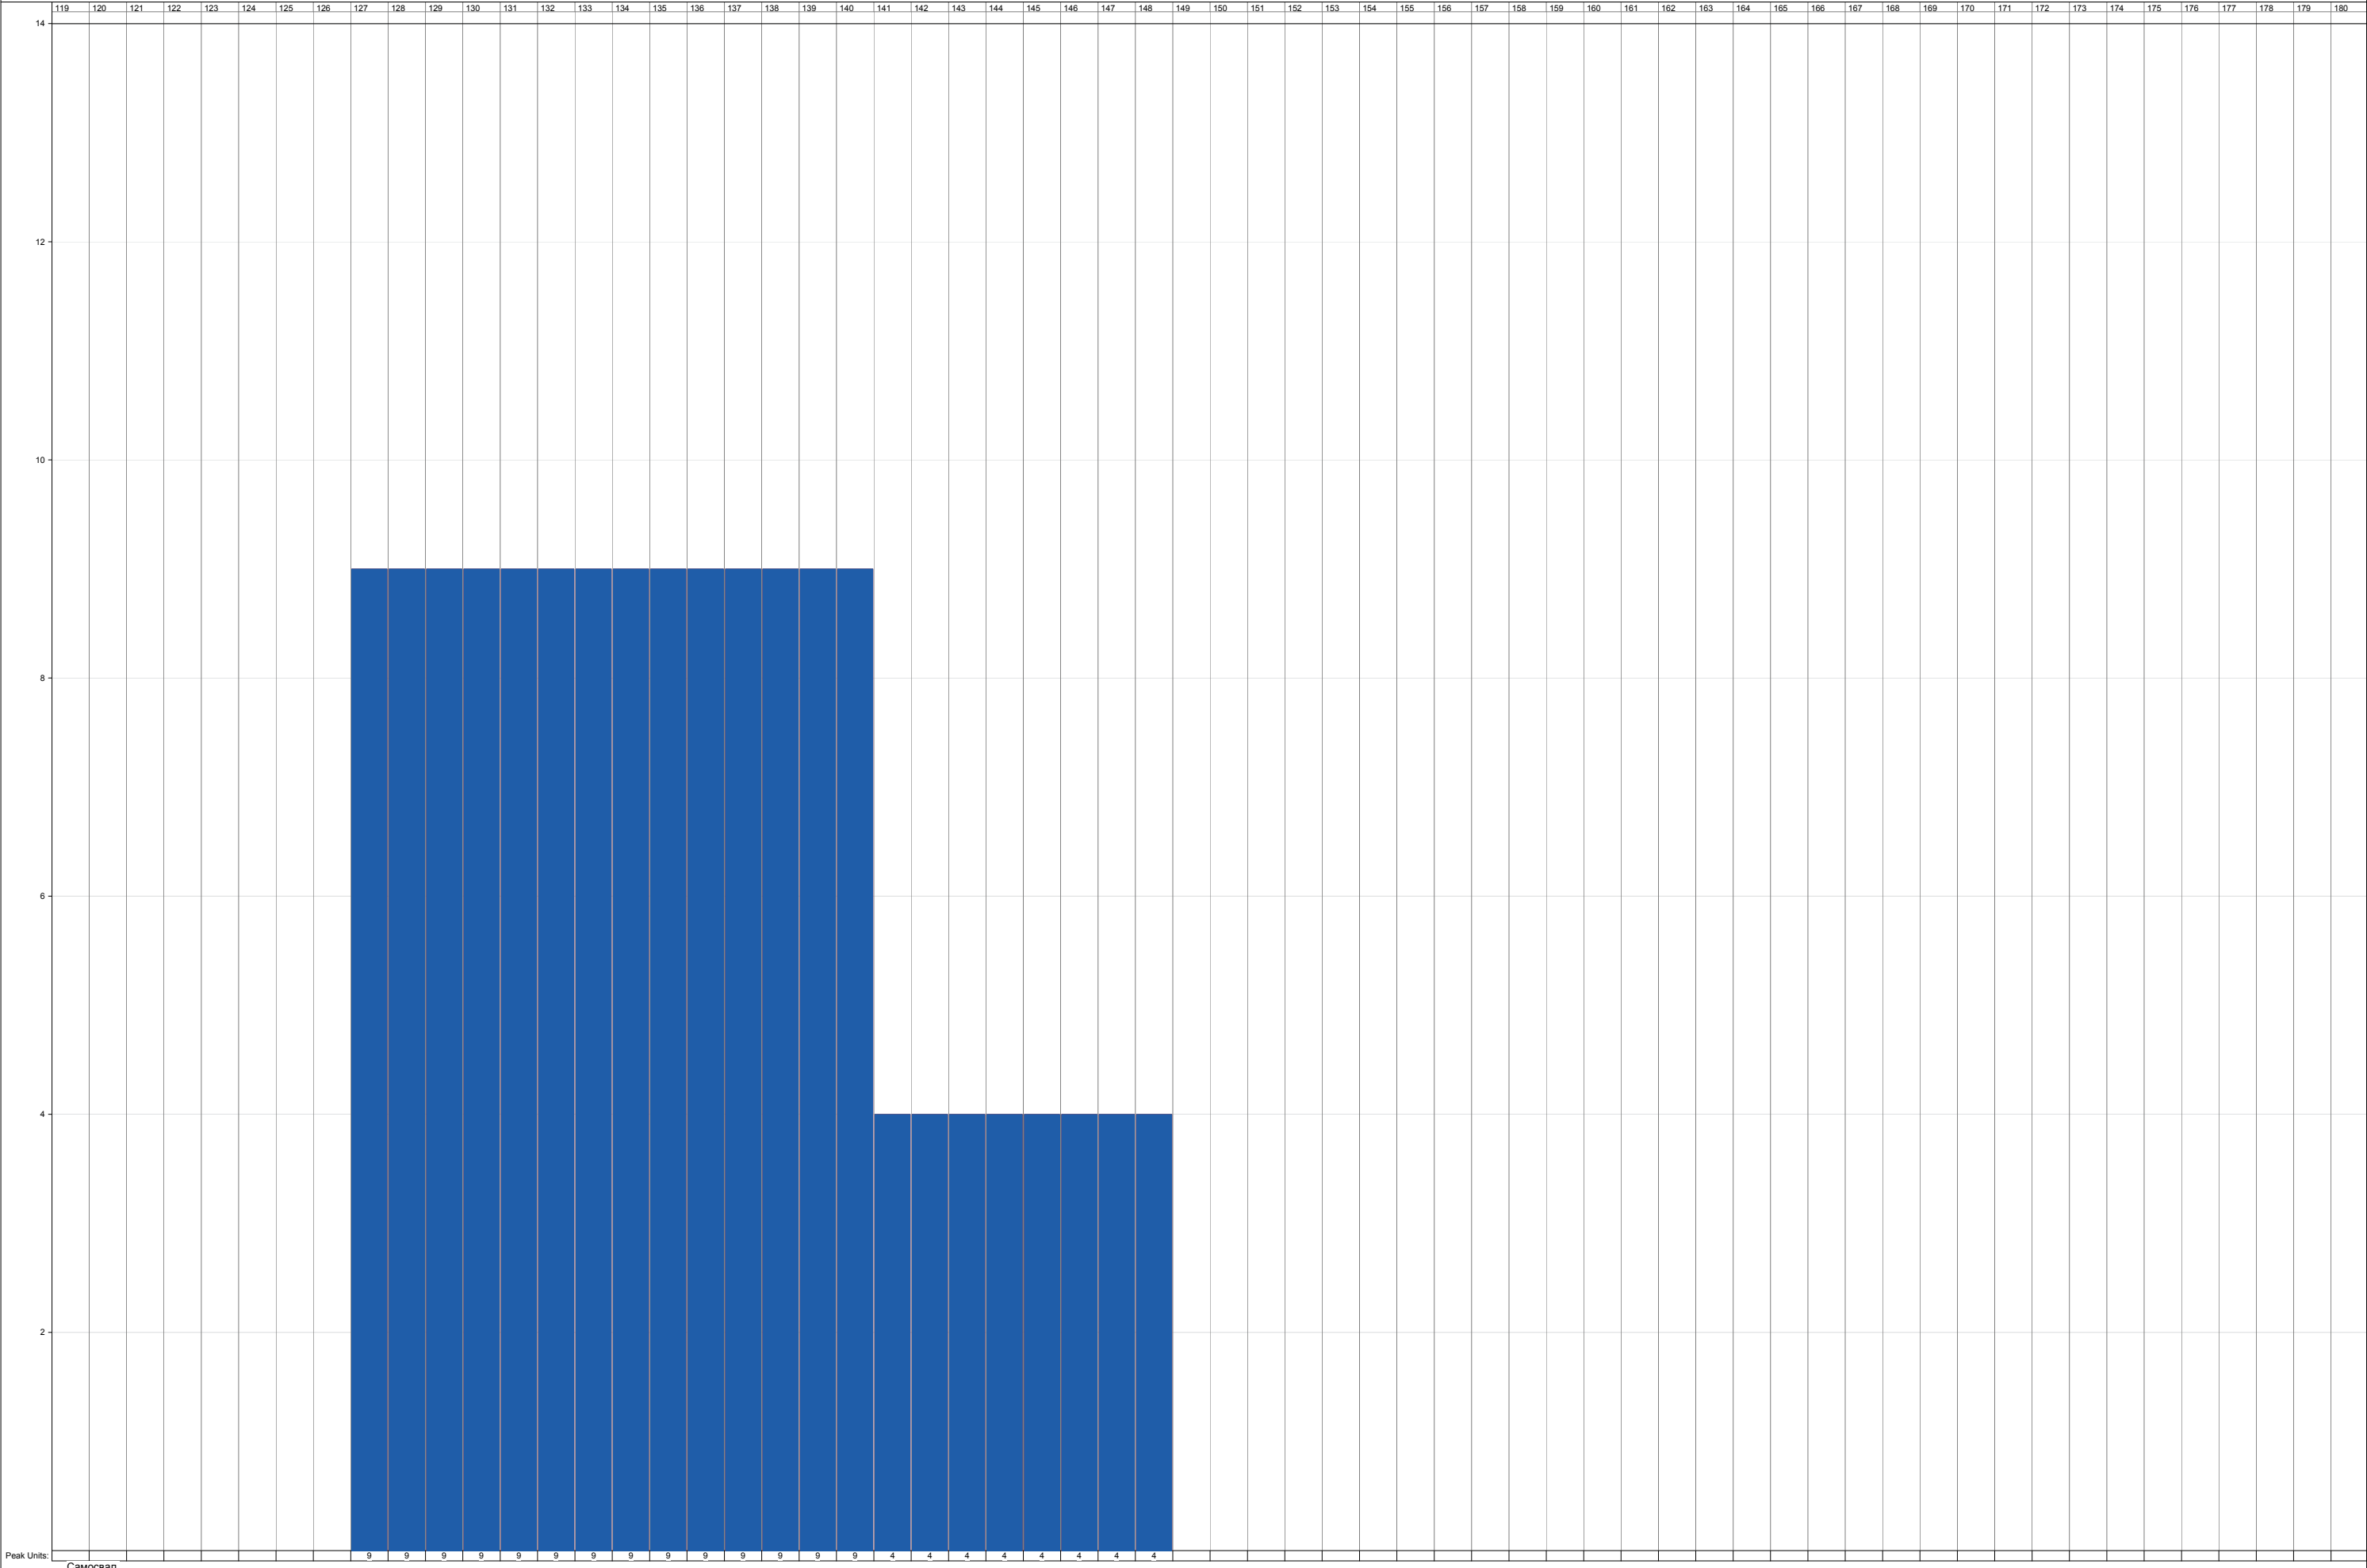


Peak Units: Самосвал Overallocated: Allocated:

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

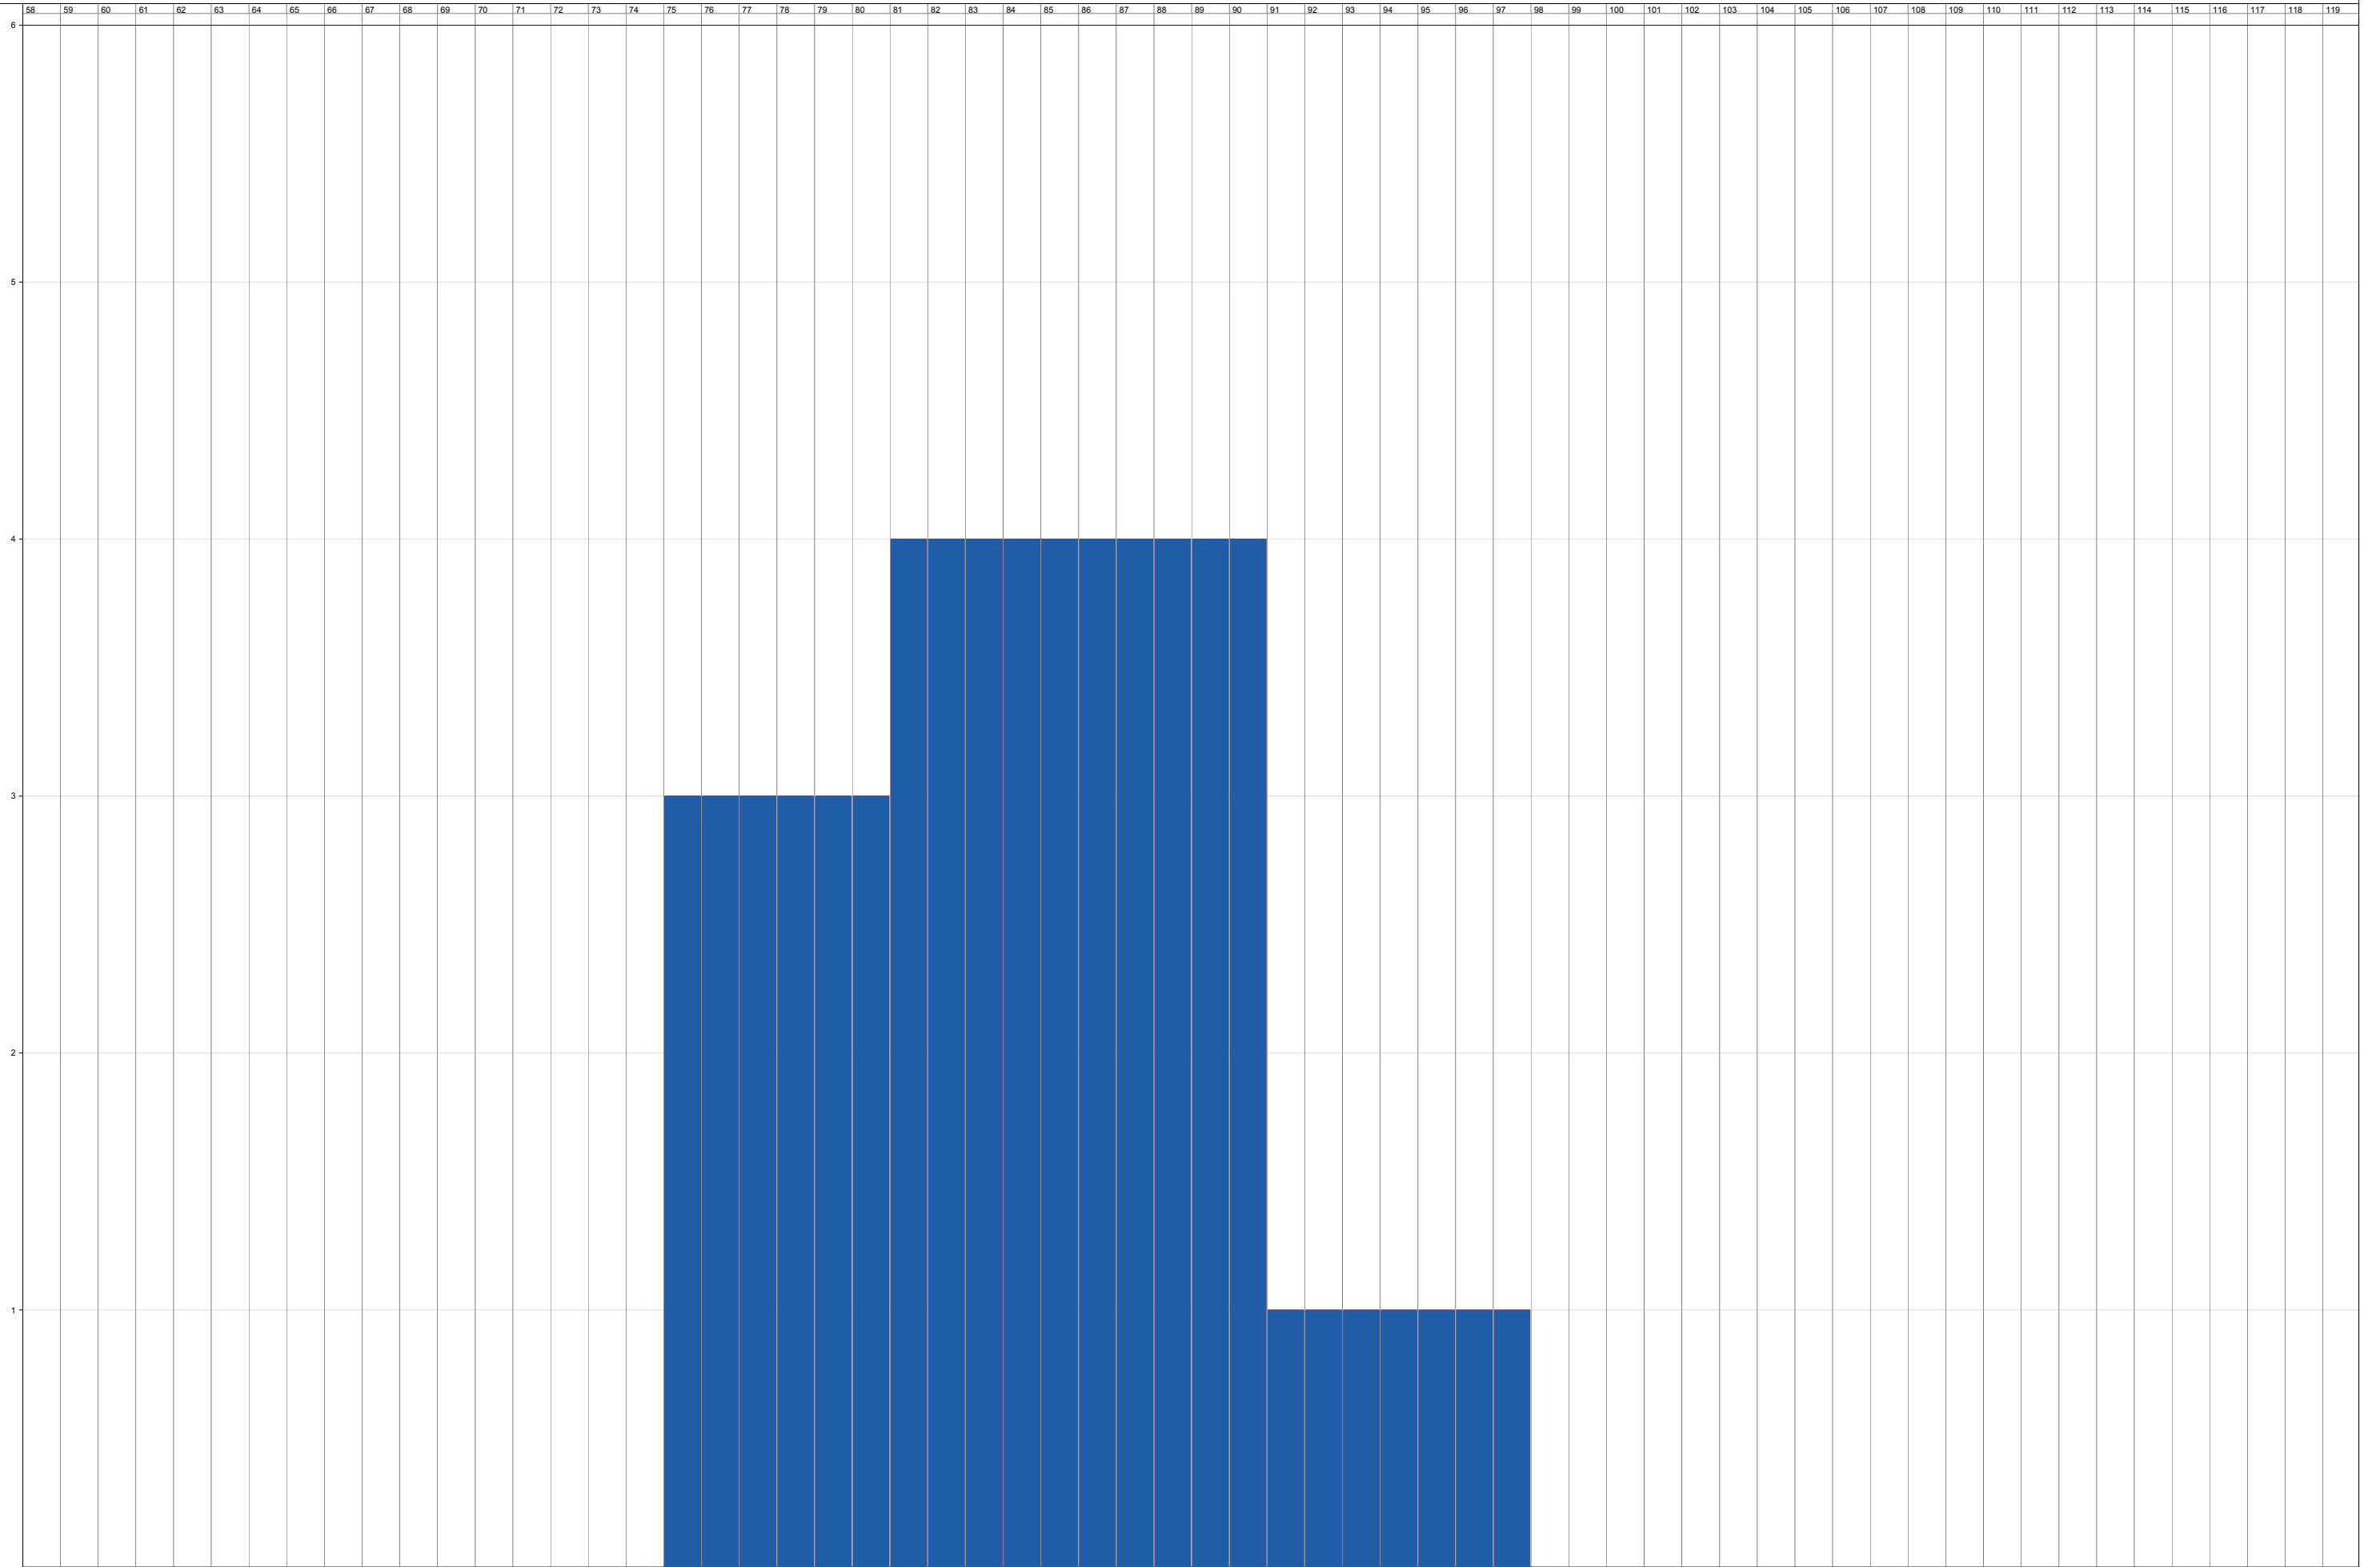


Peak Units: **Ваняк** Overallocated: █ Allocated: █

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

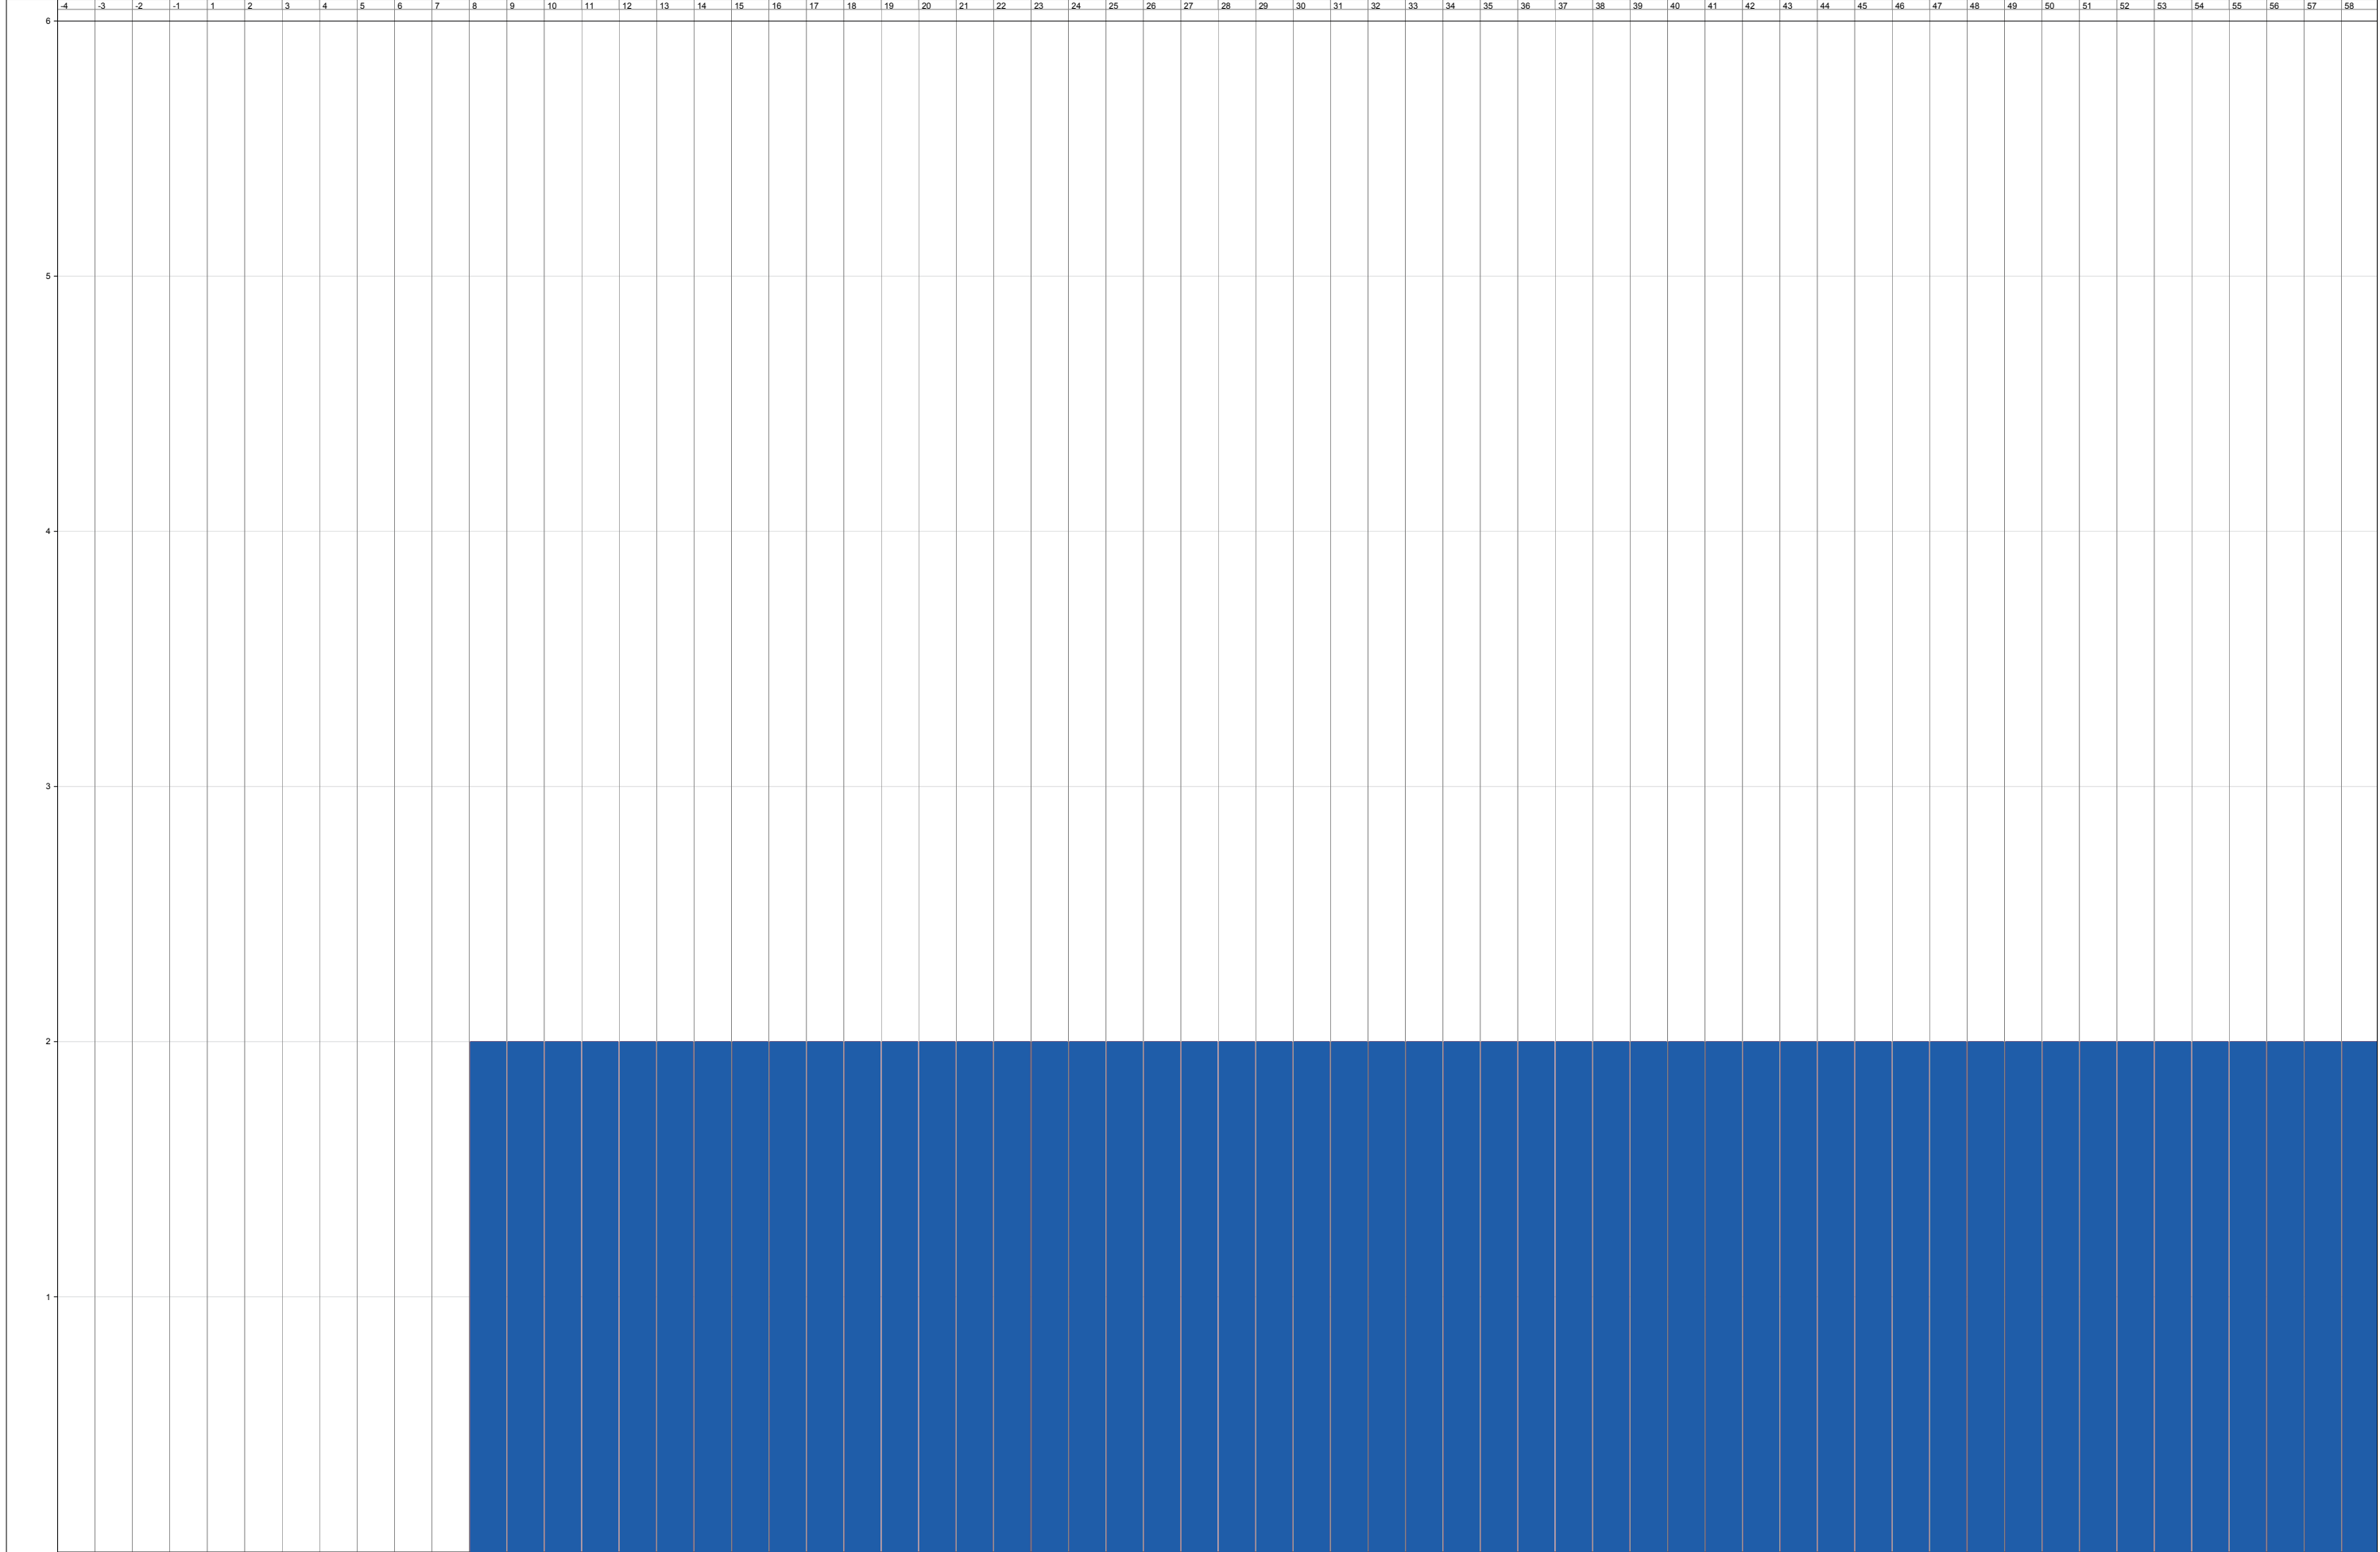


Peak Units: Булдoзeр Overallocated: █ Allocated: █

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА




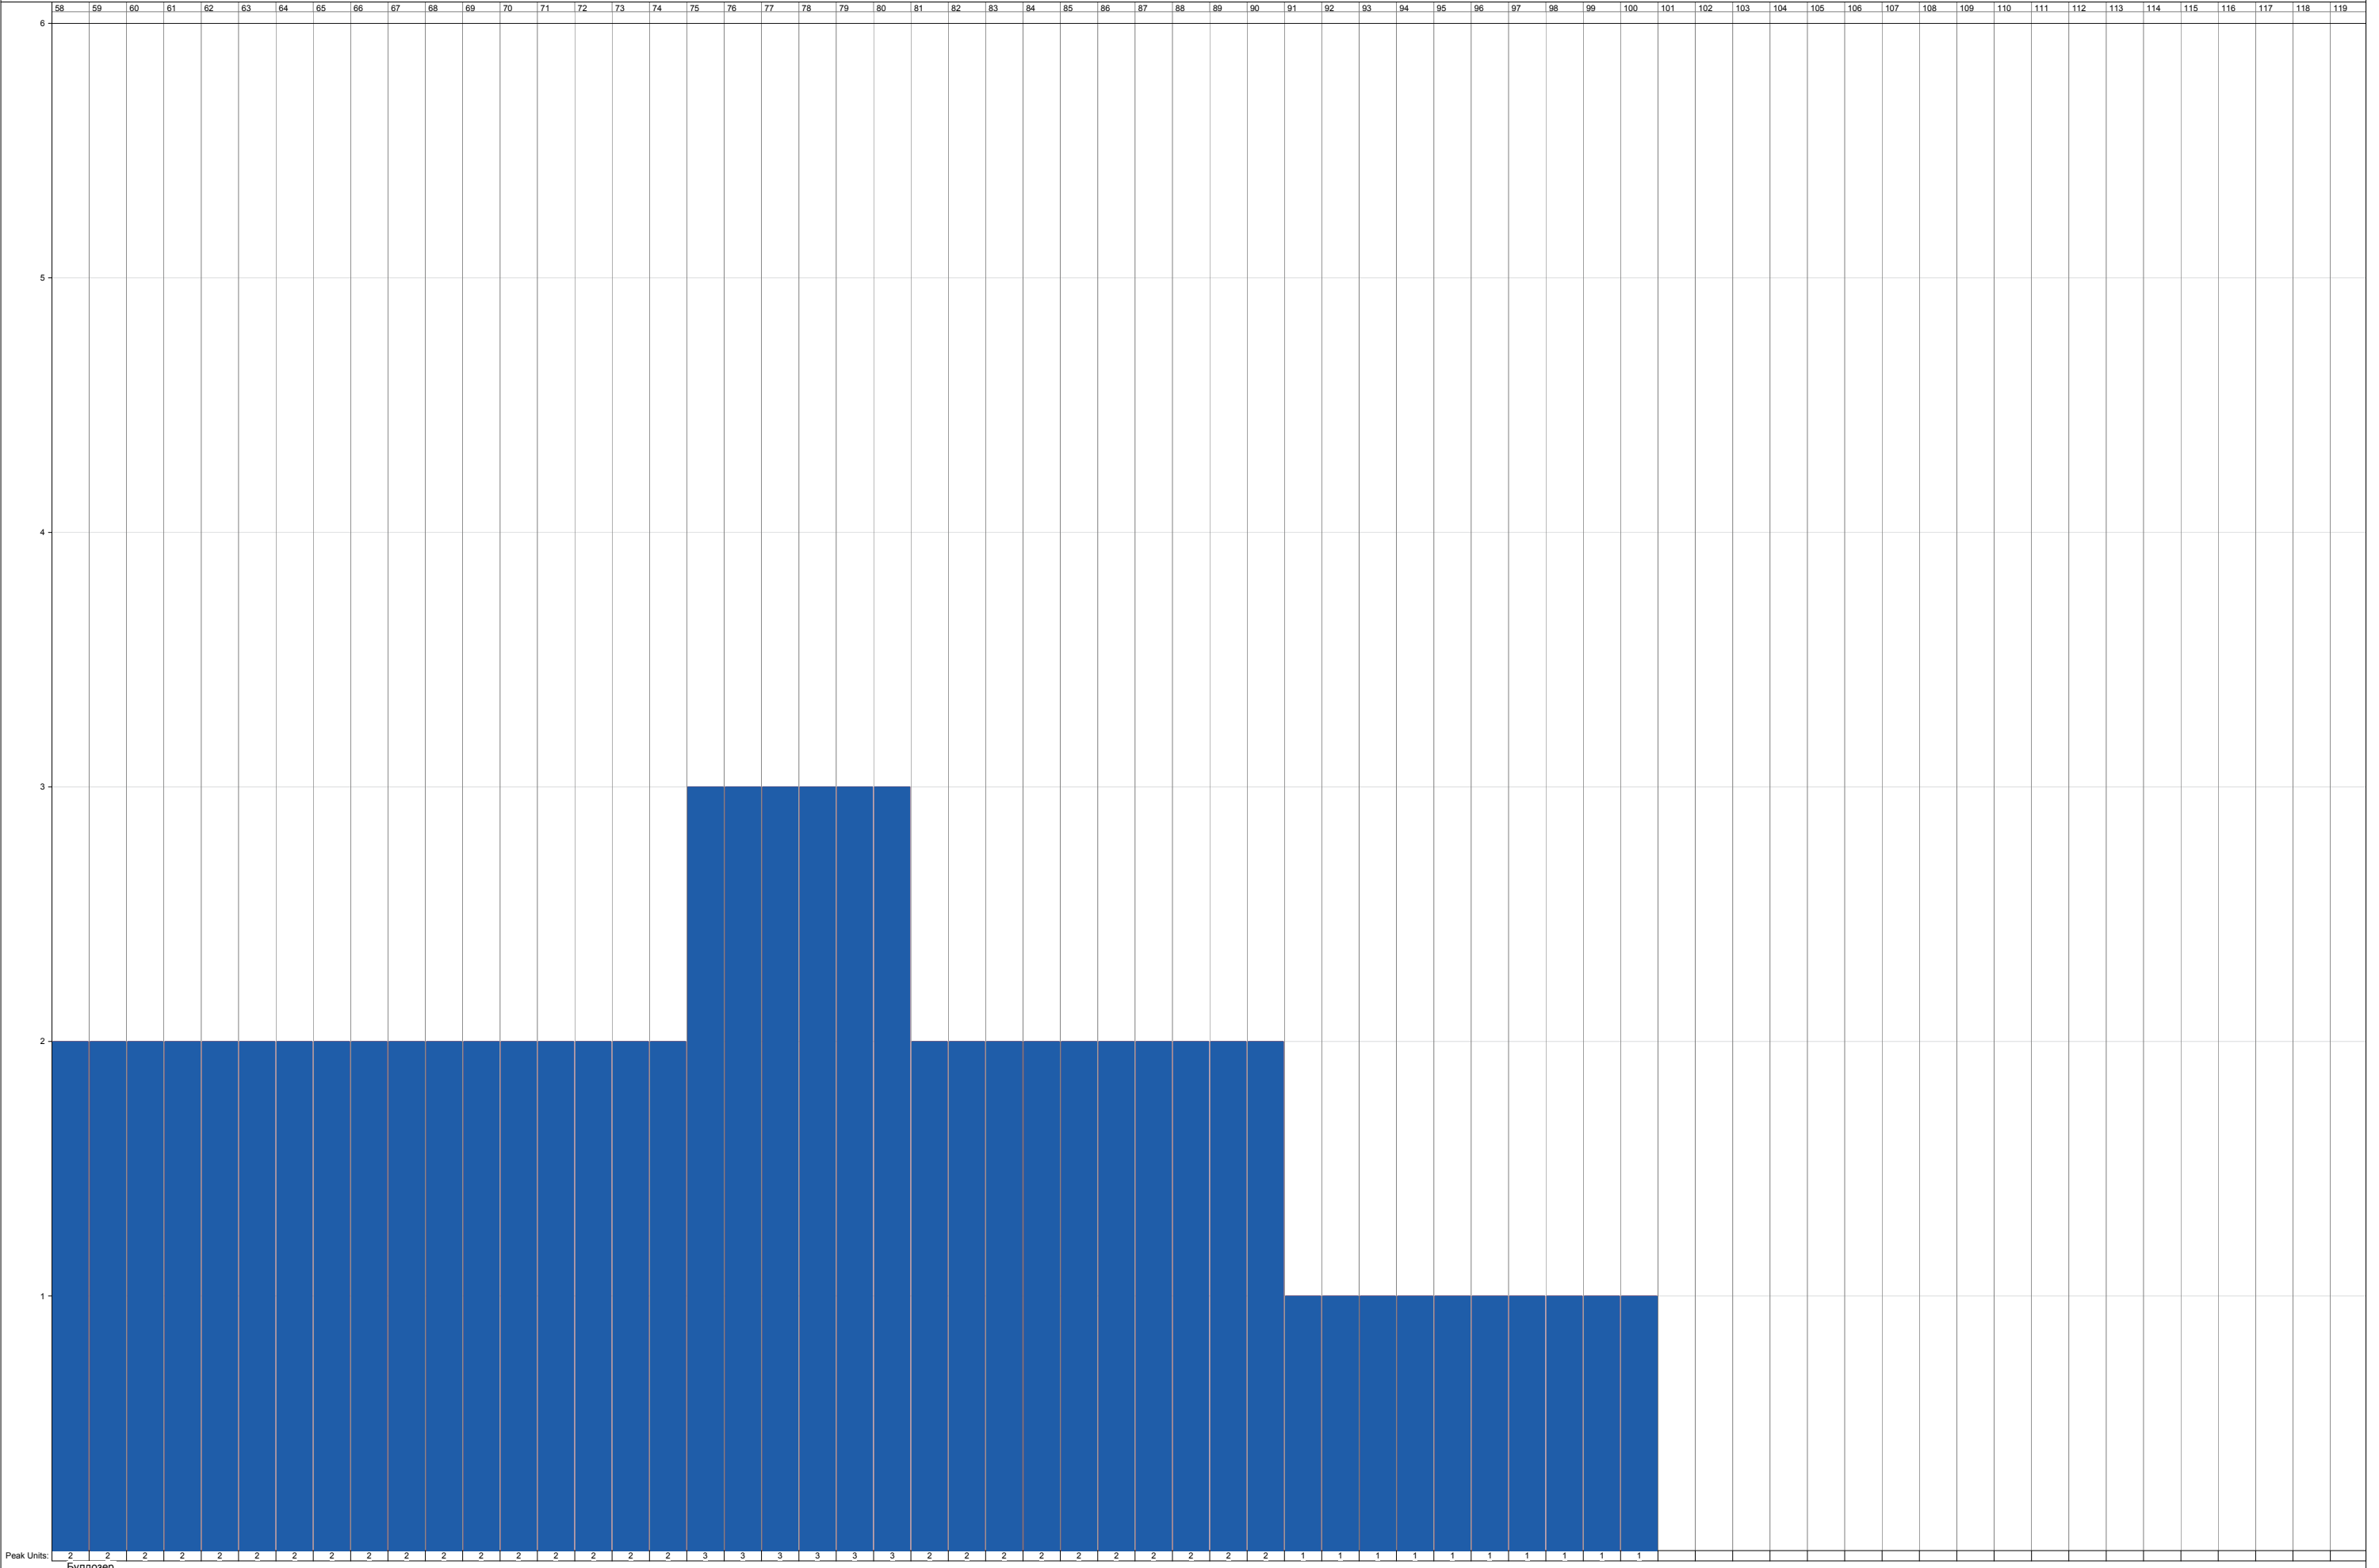






Peak Units: Булдoзeр
 Overallocated: █ Allocated: █





ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА




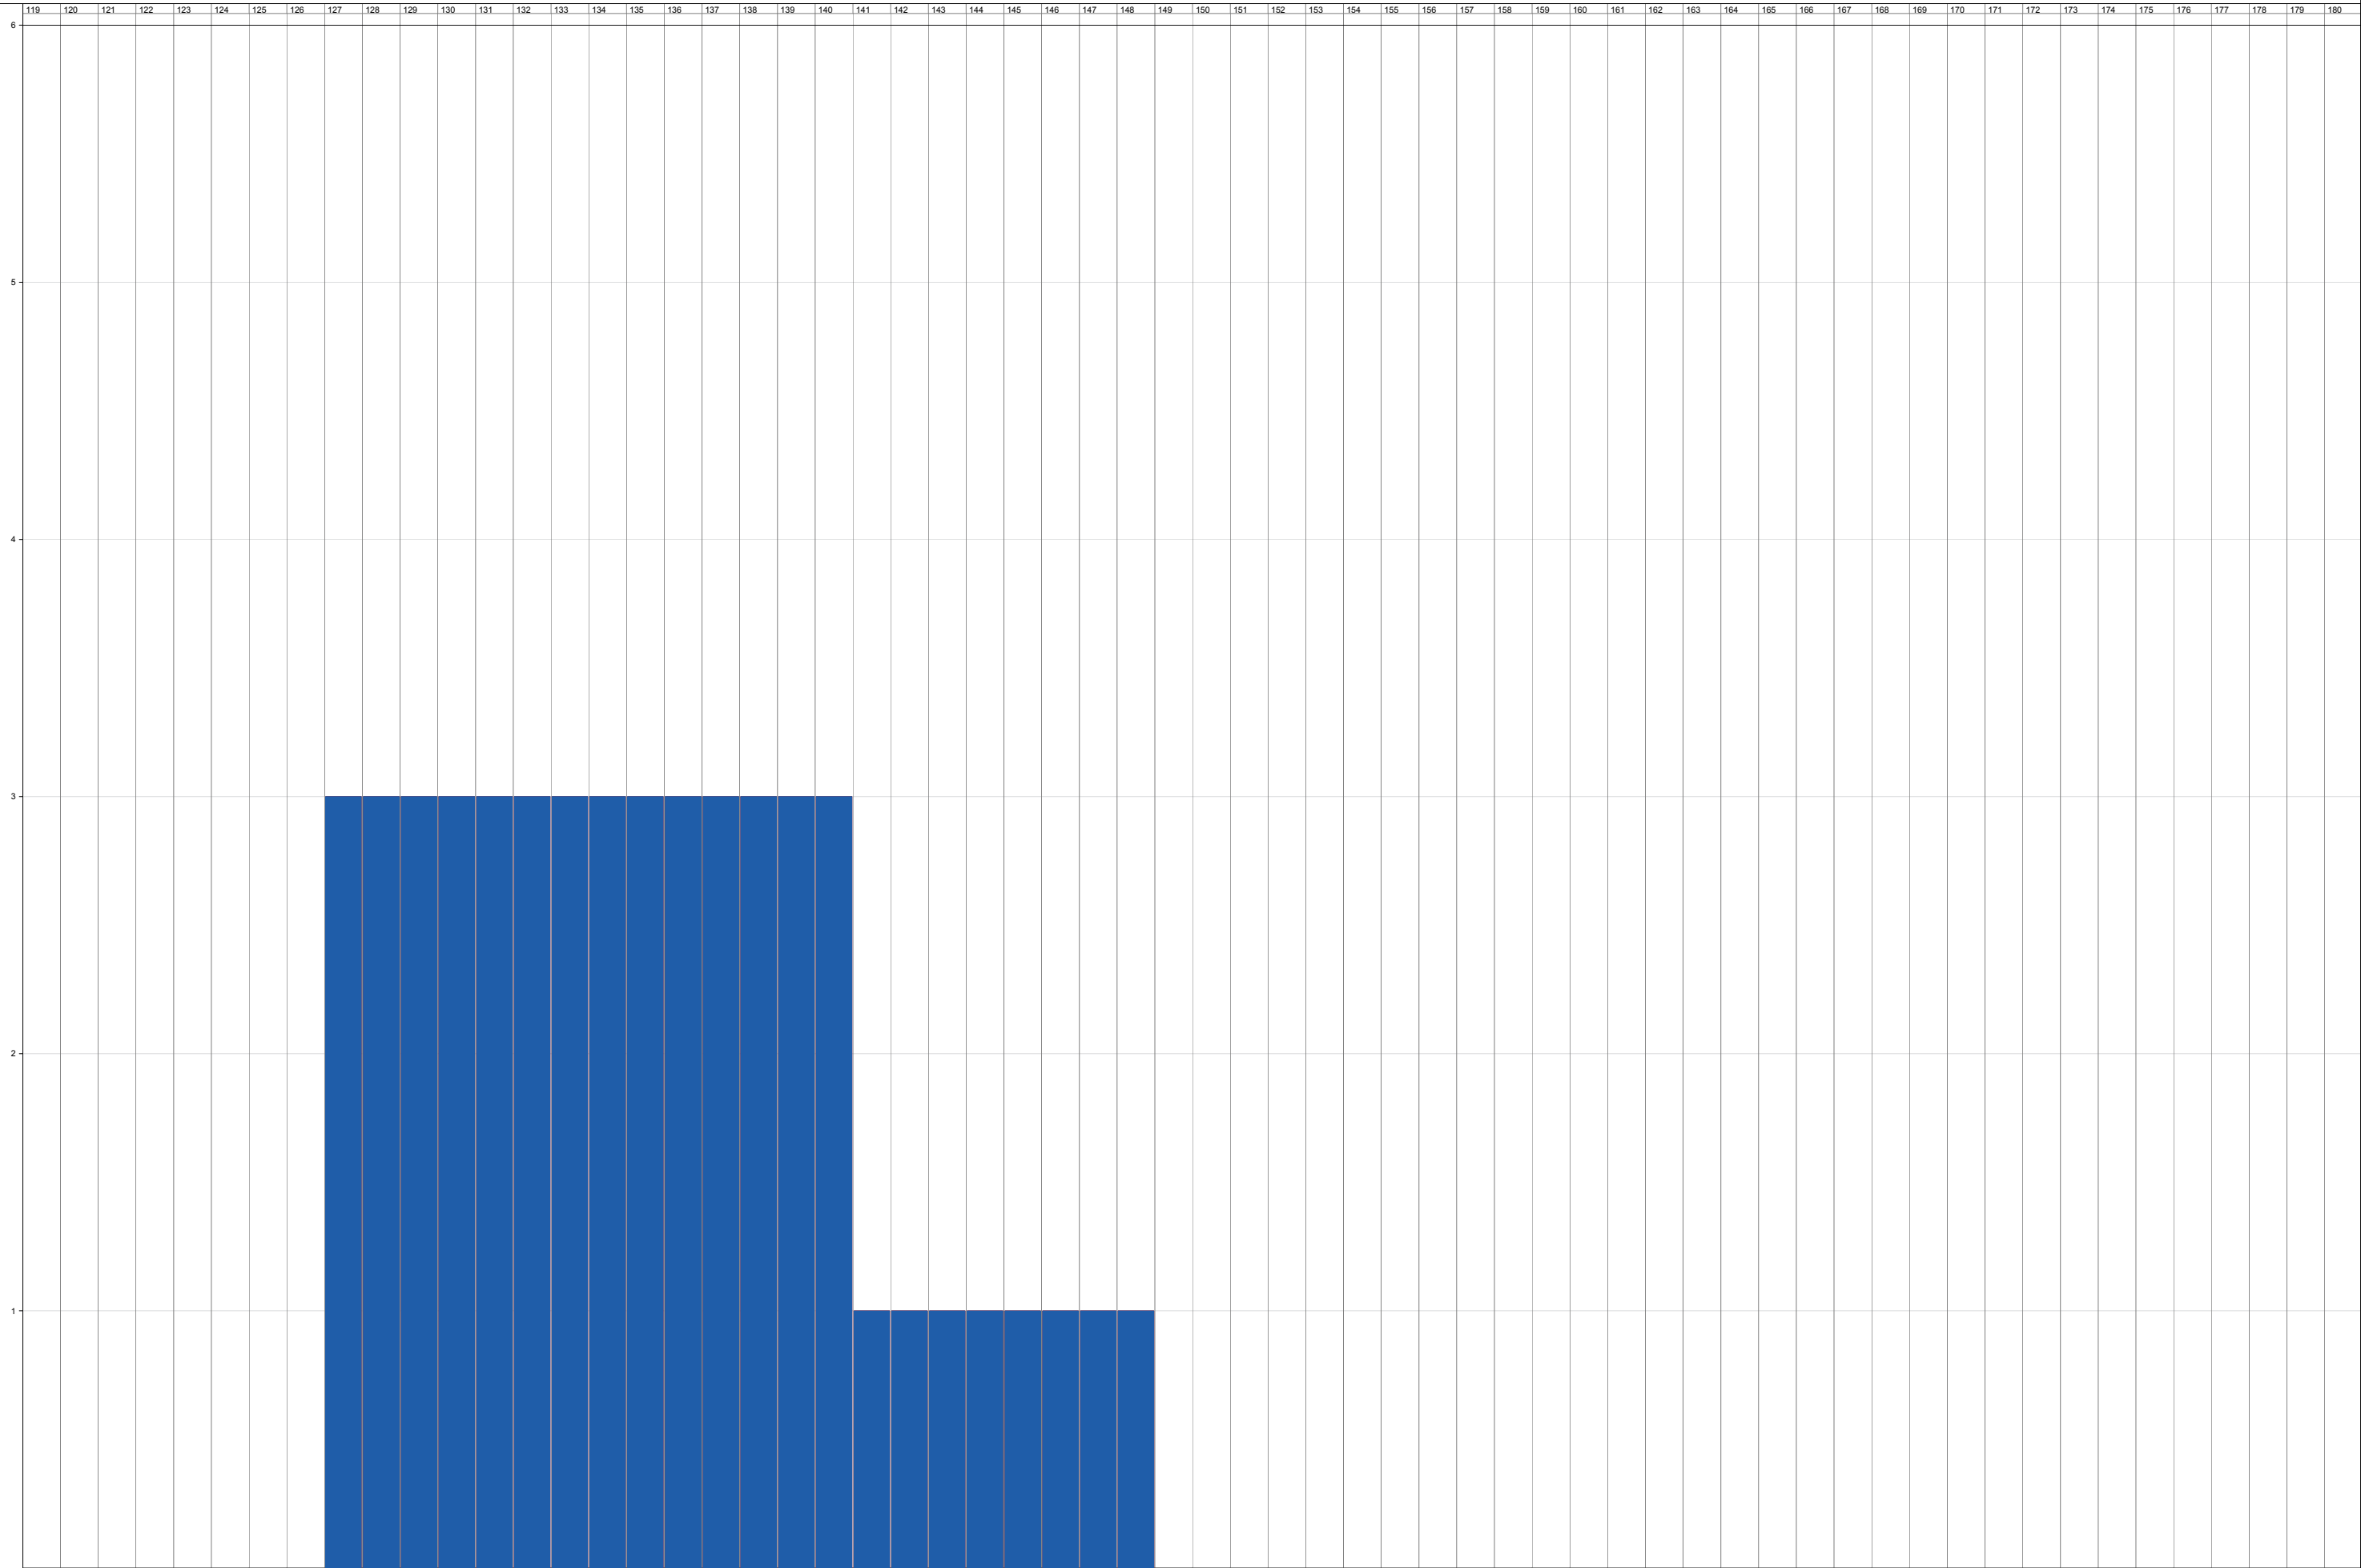


Peak Units: Булдoзeр
Overallocated: █ Allocated: █

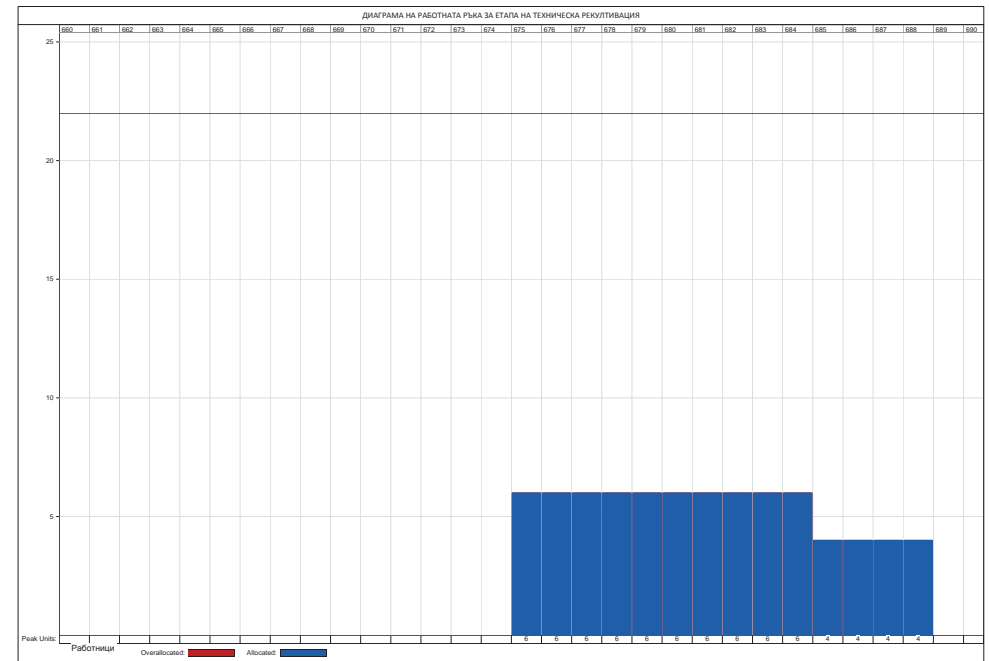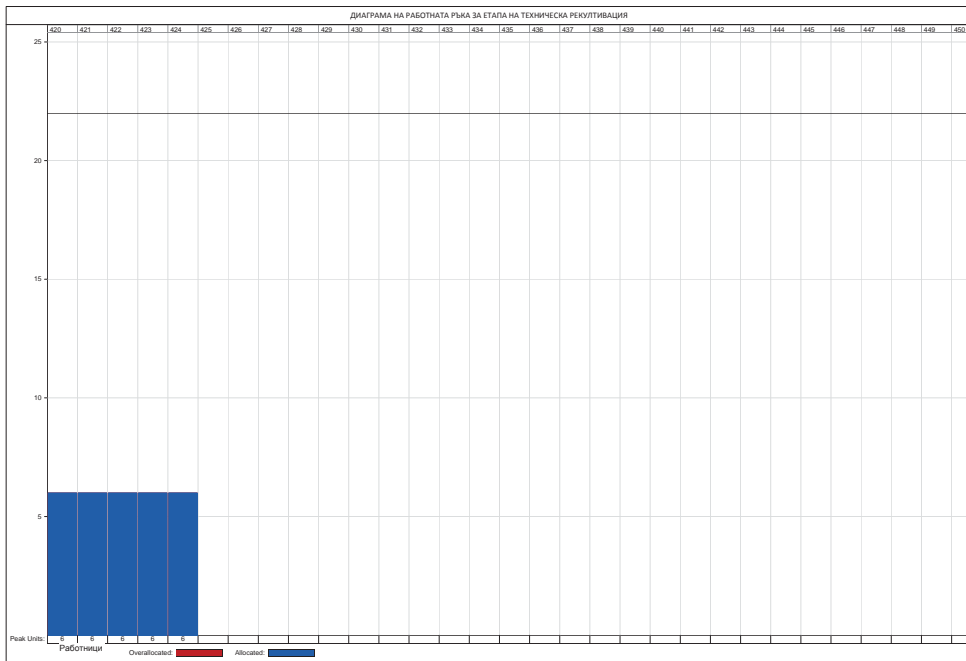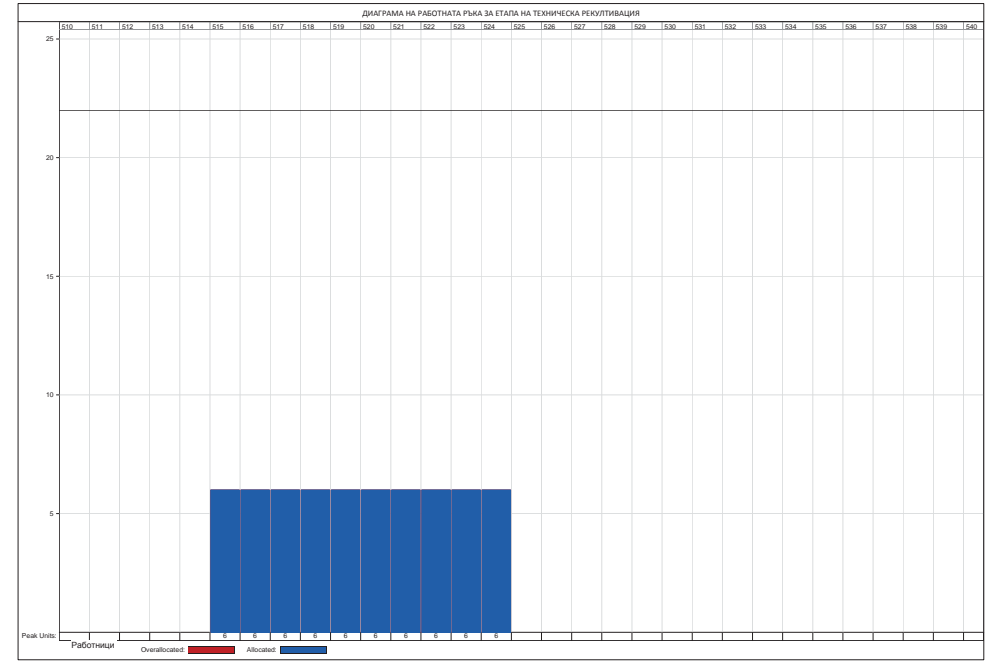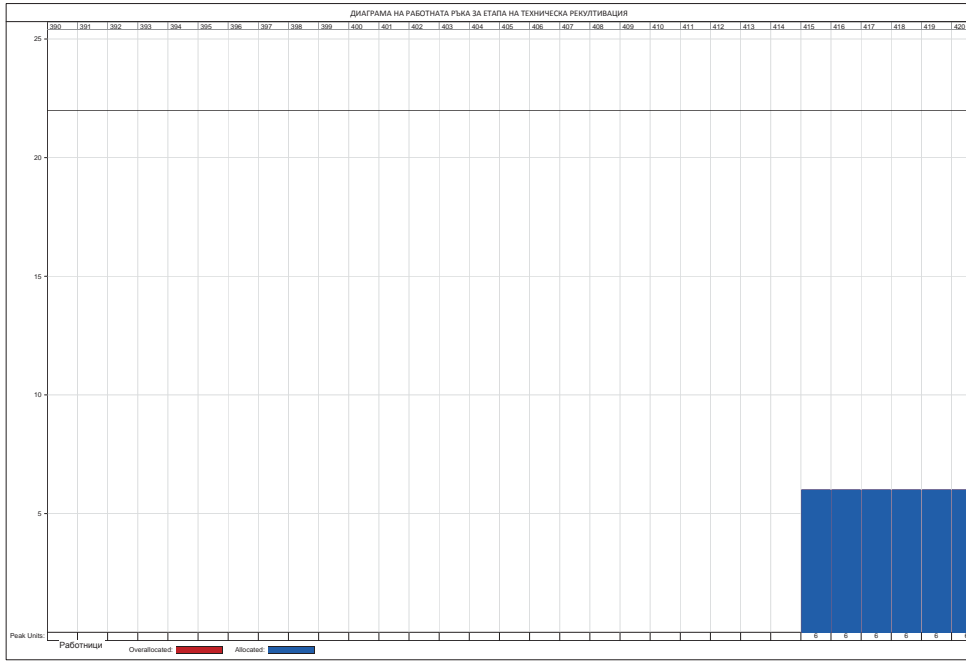


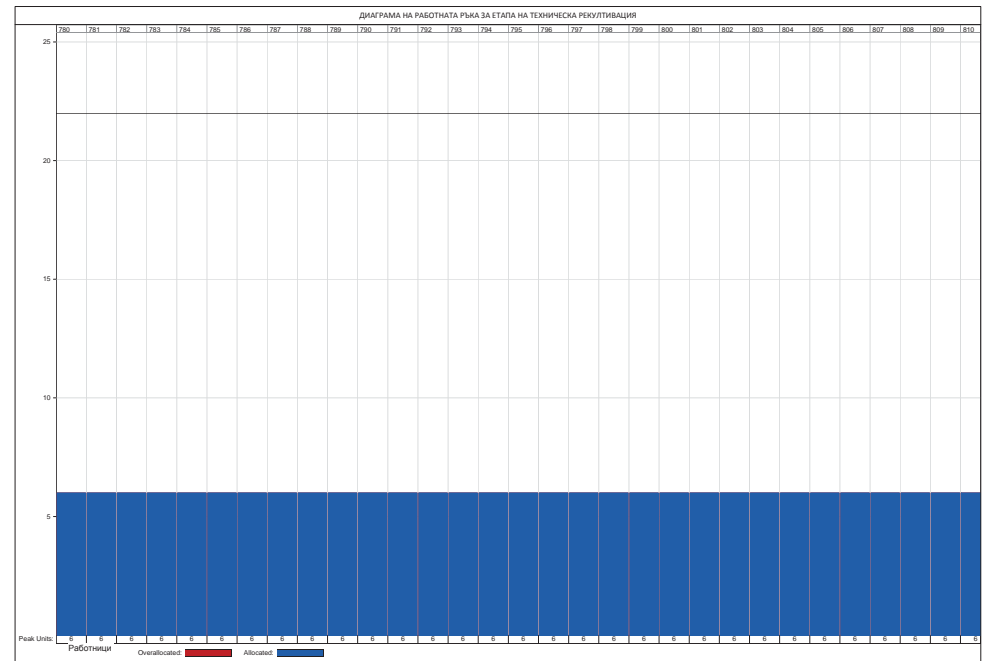
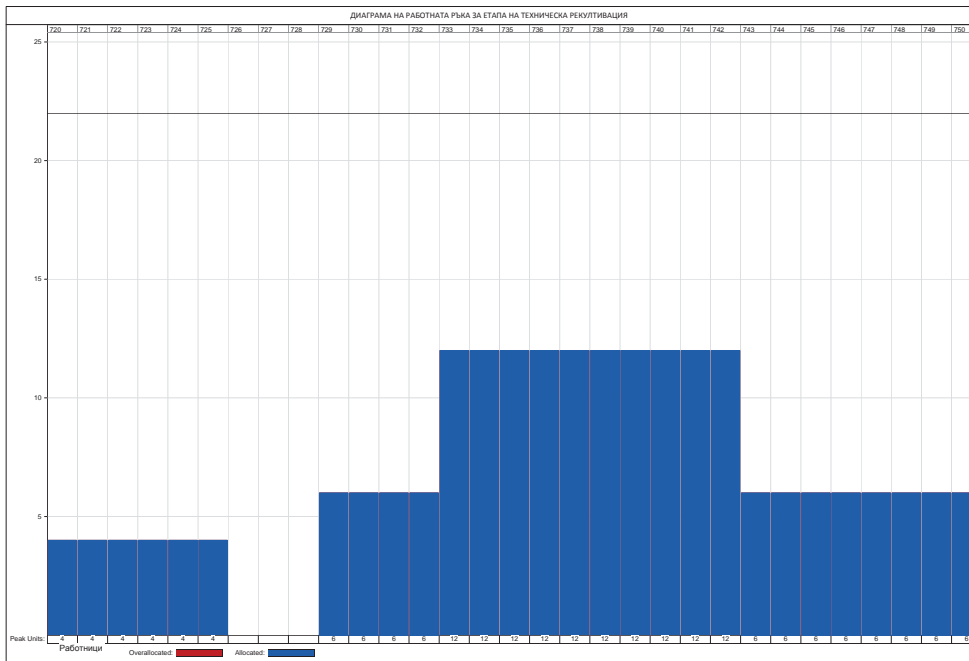
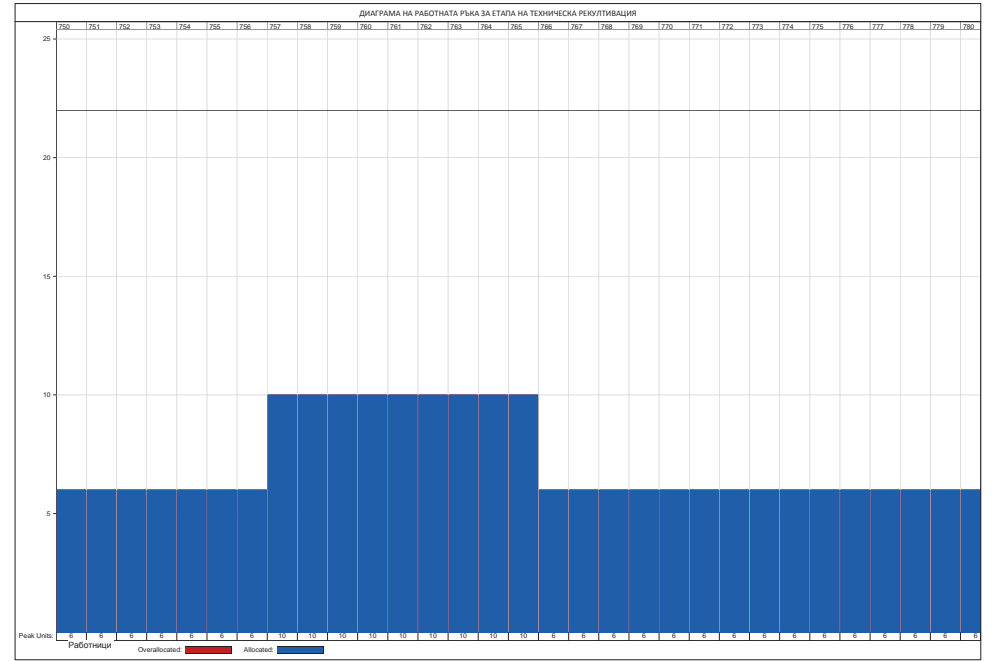
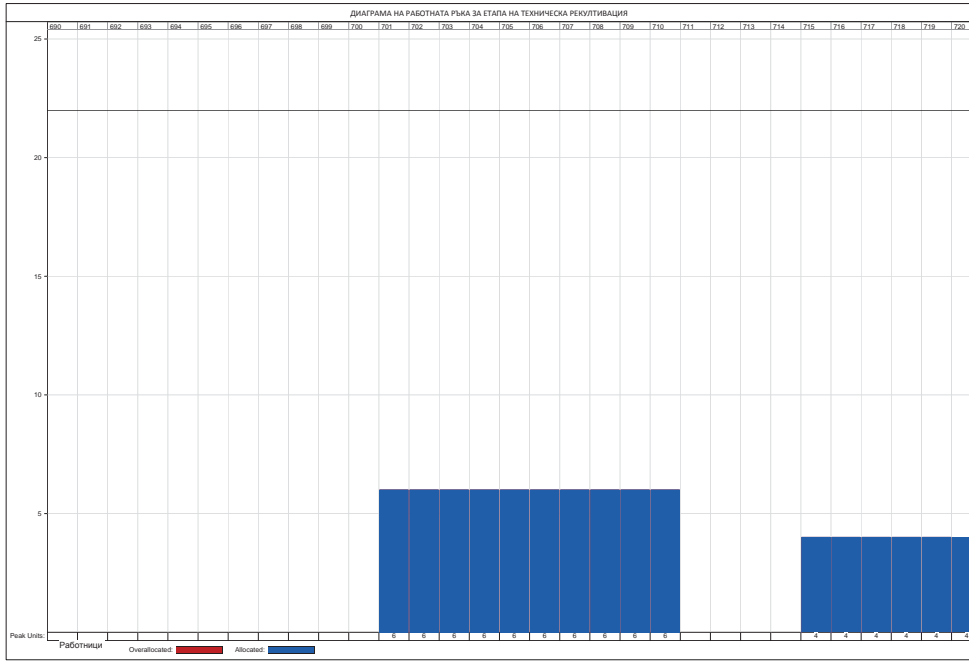


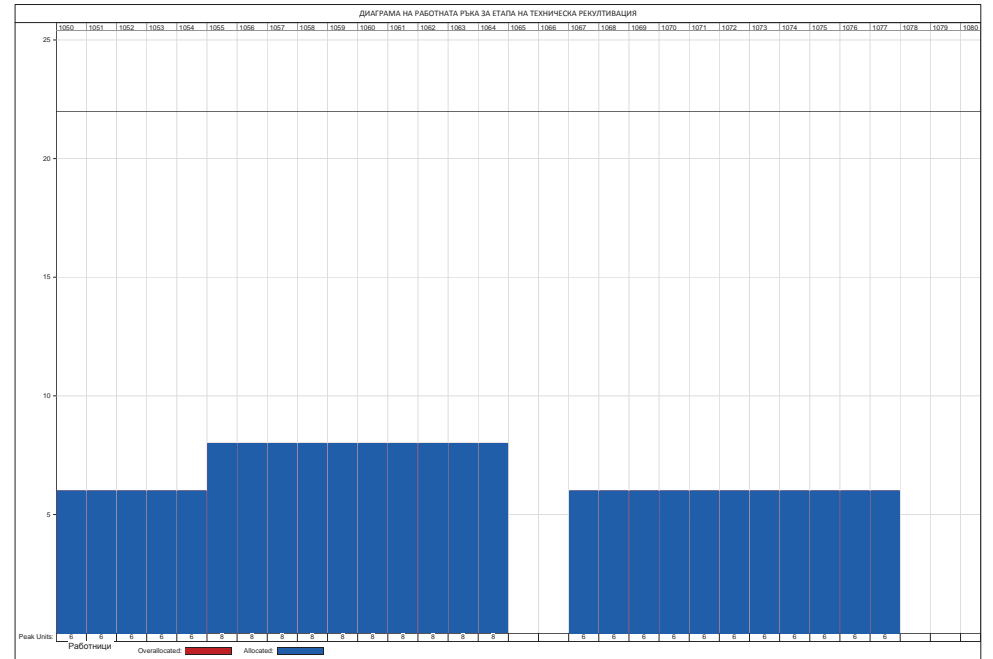
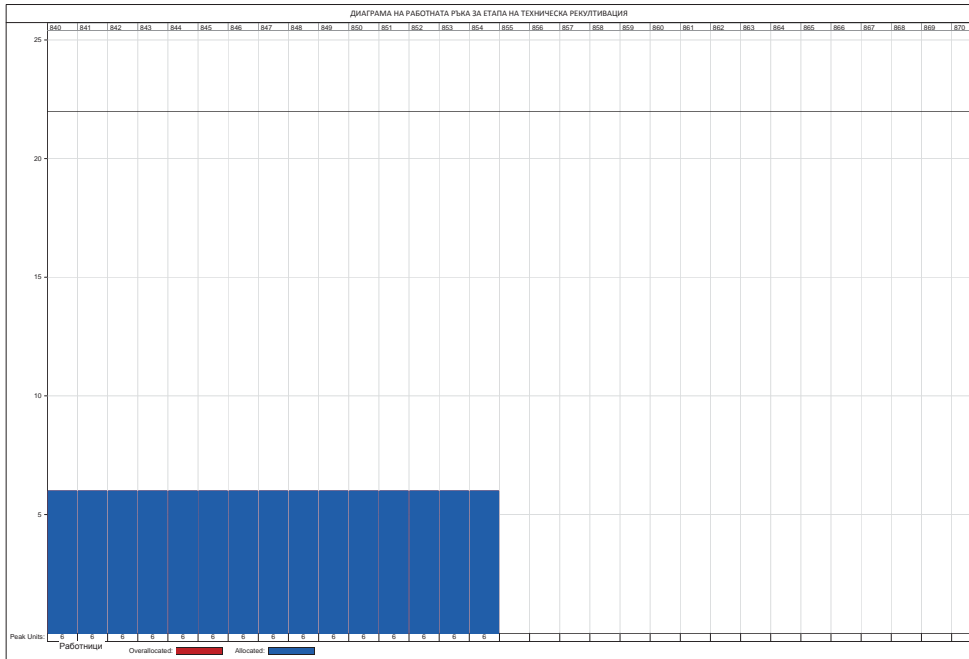
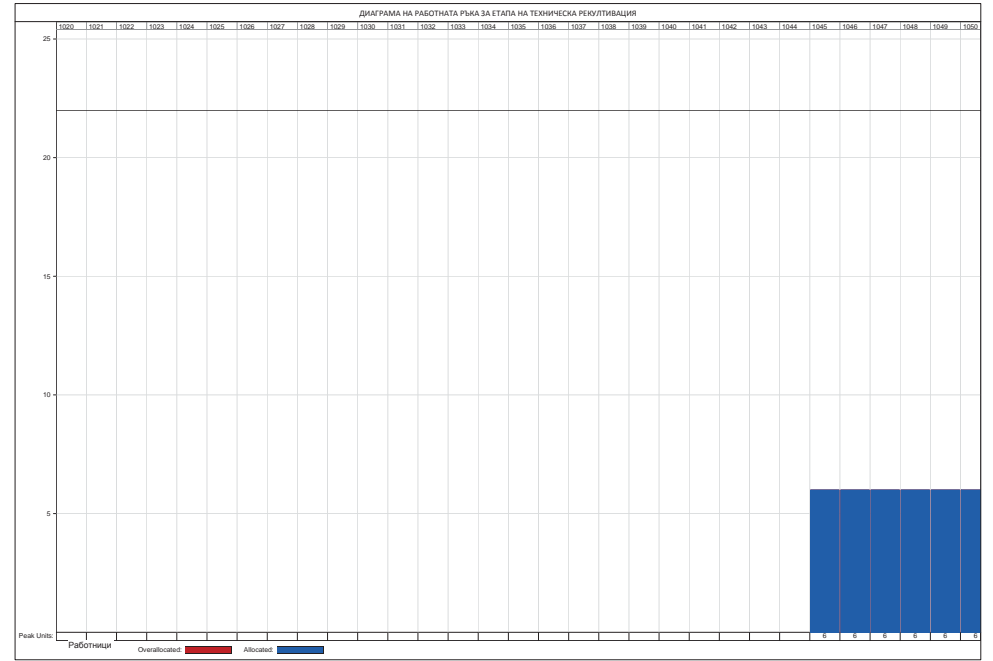
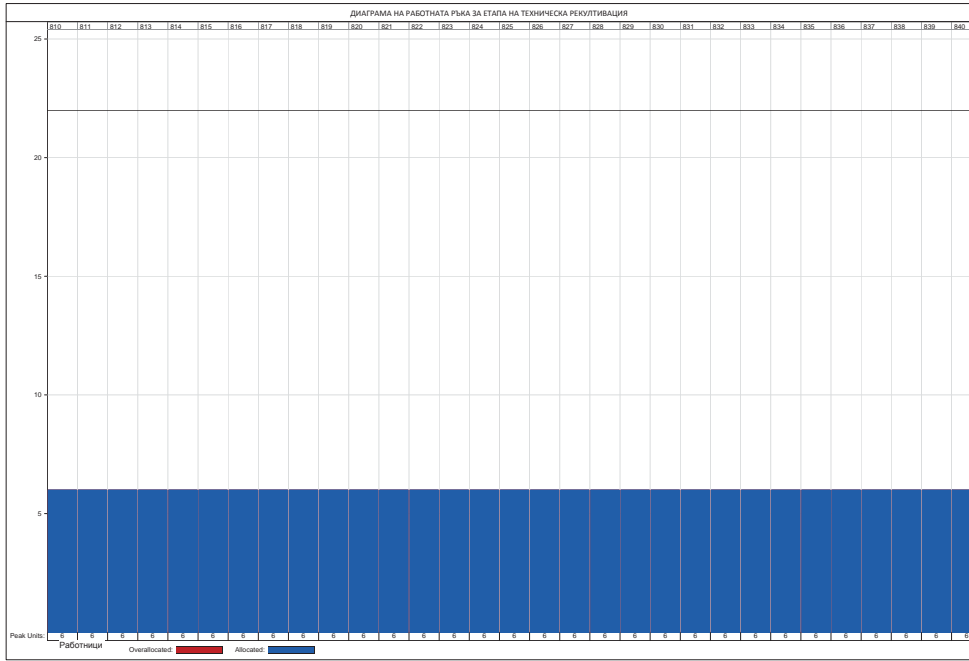


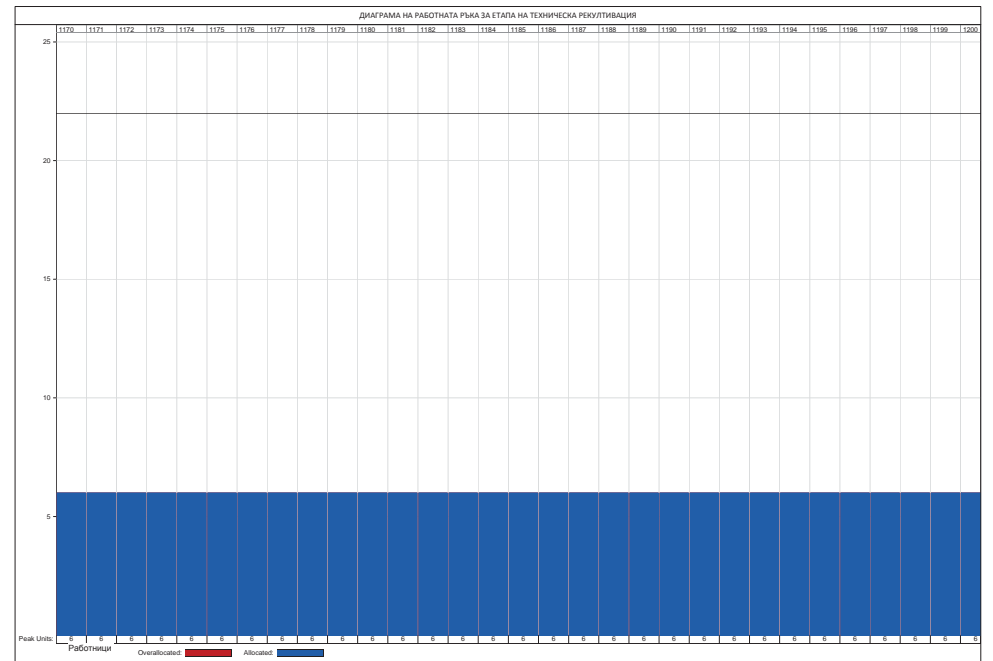
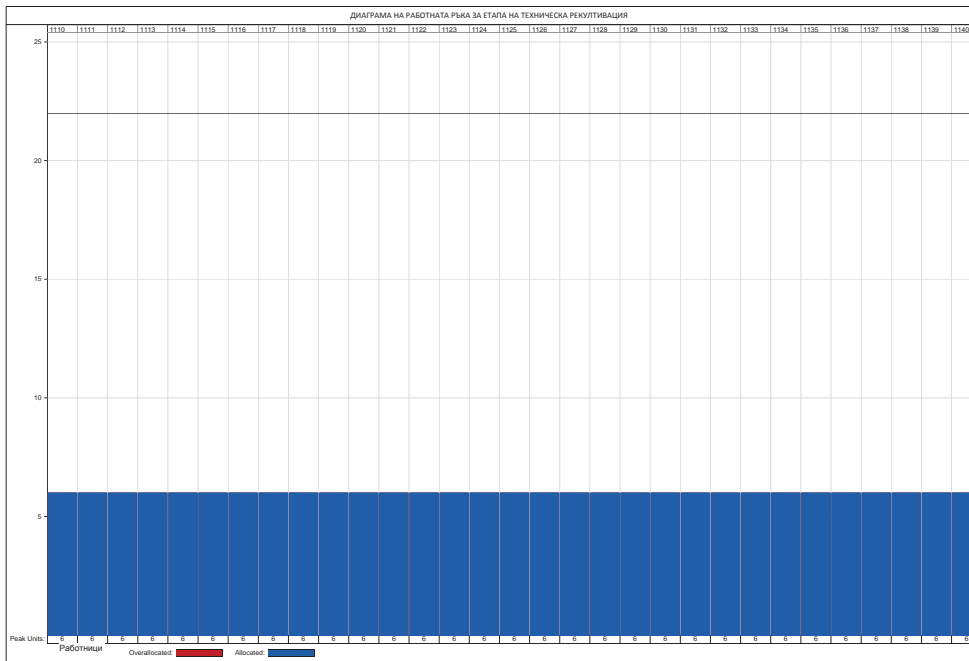
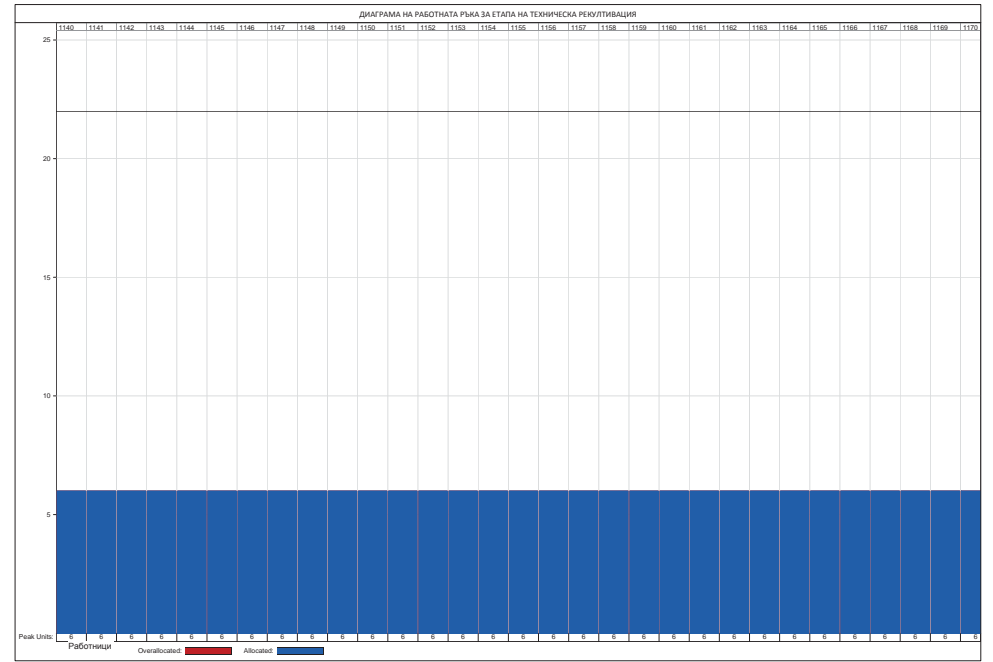
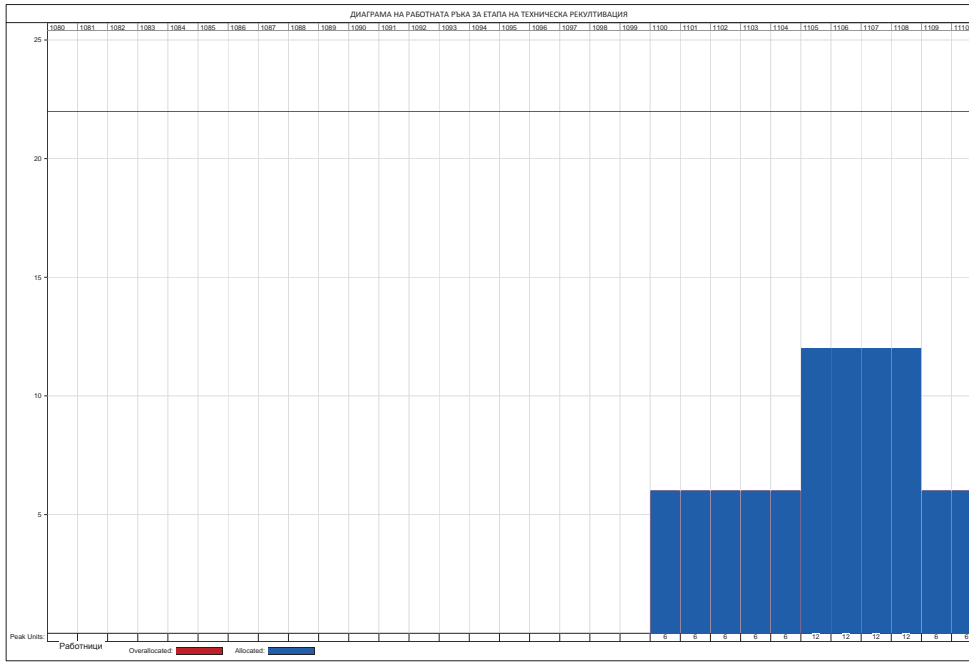


ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА ЗА СТАПА НА ТЕХНИЧЕСКА РЕКВИЗИЦИЯ

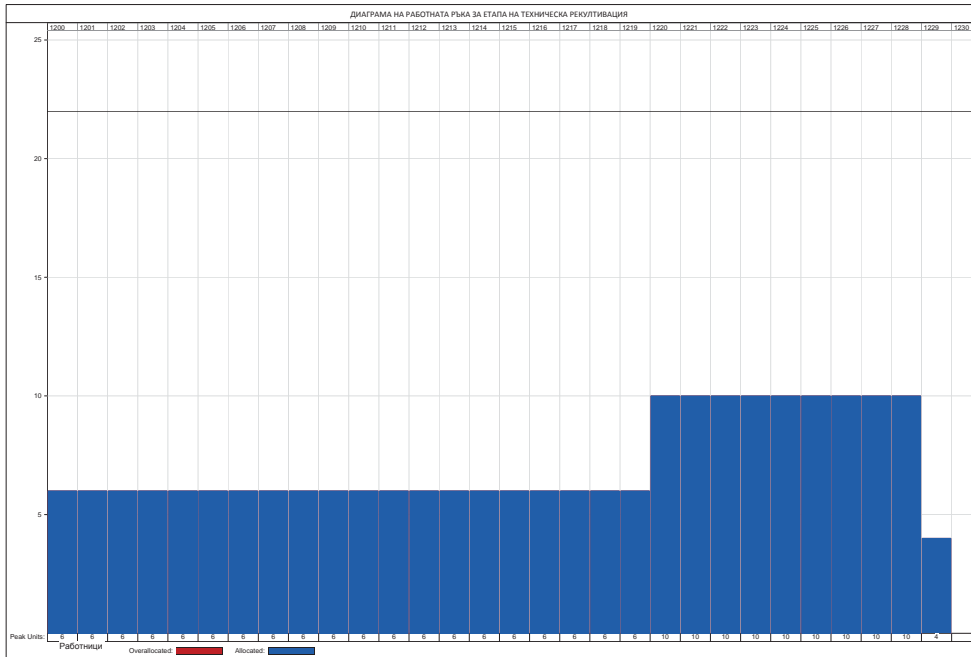

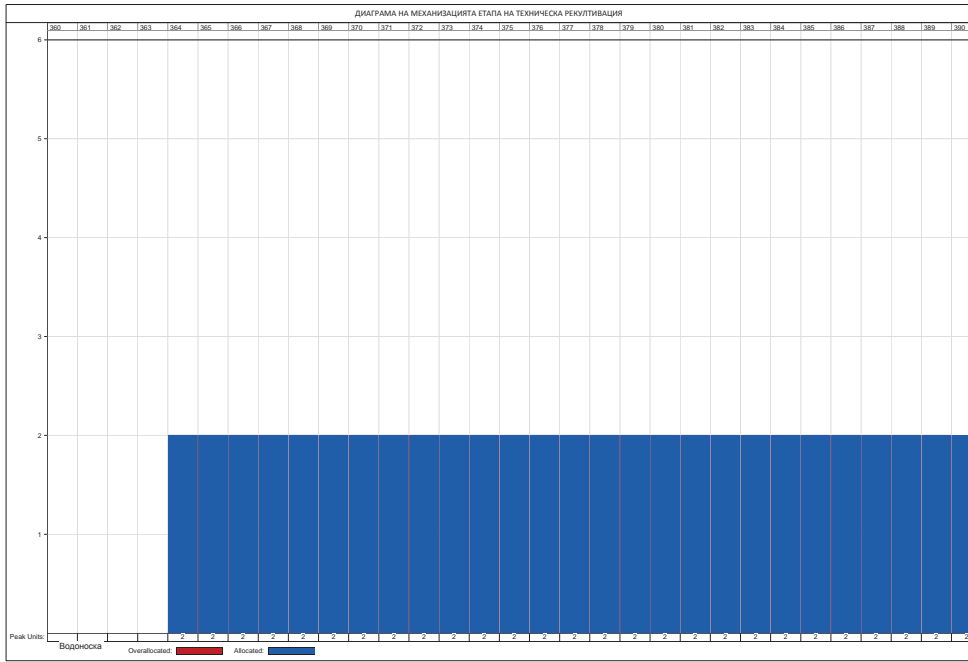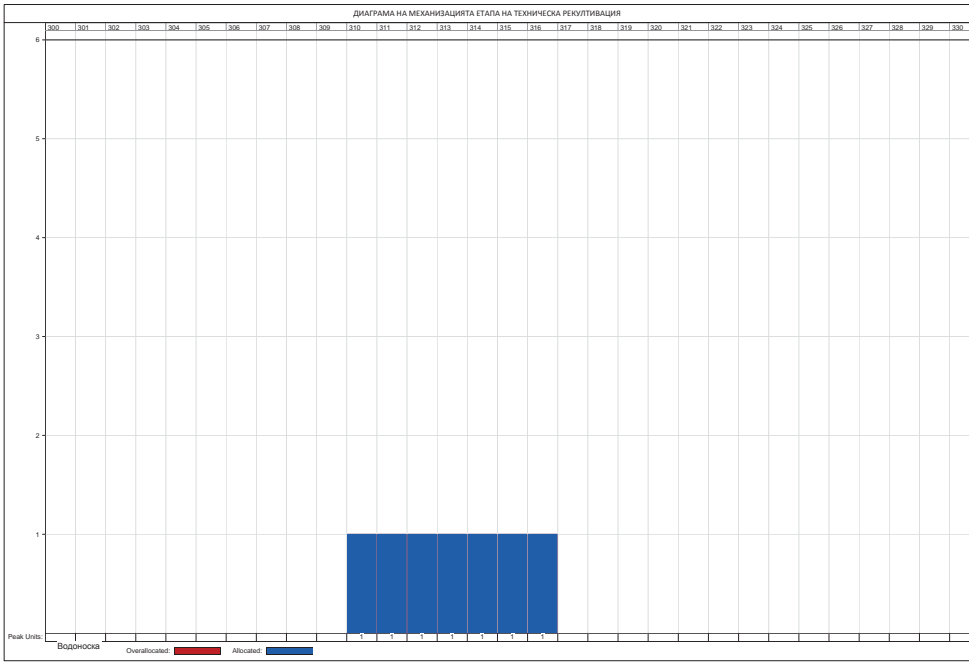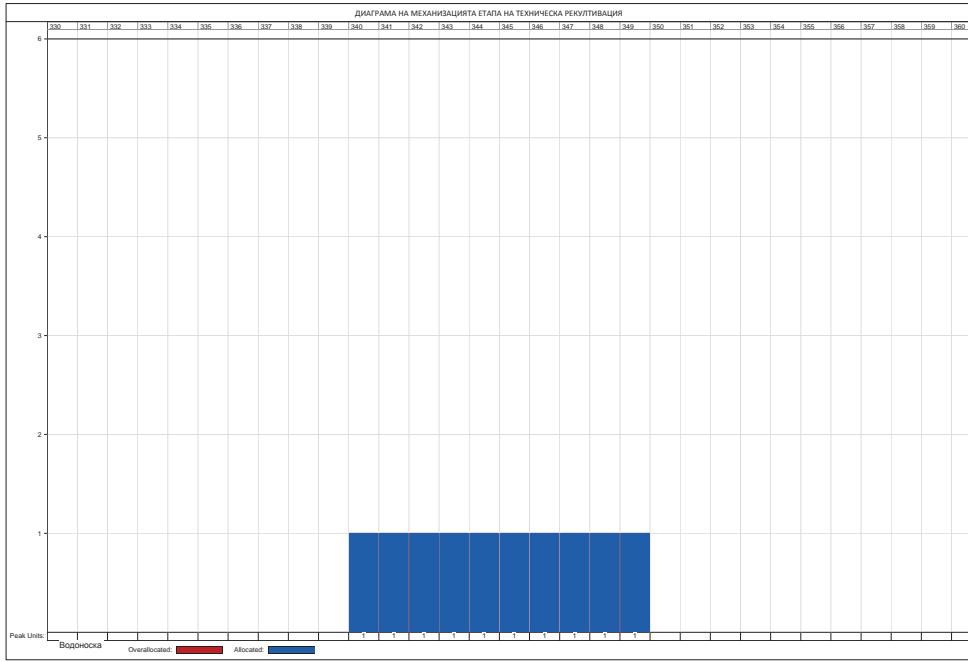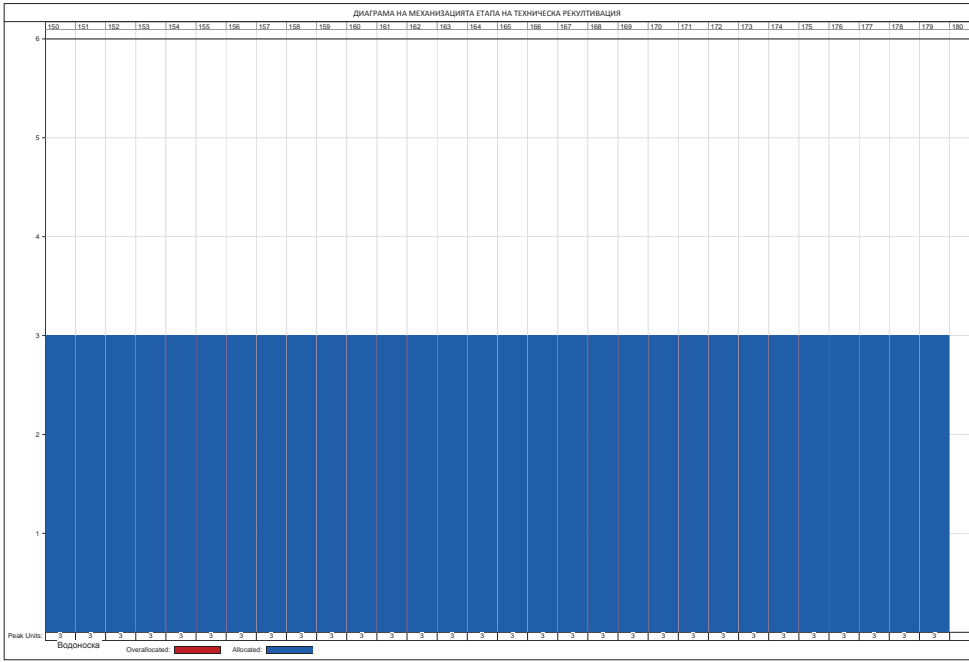

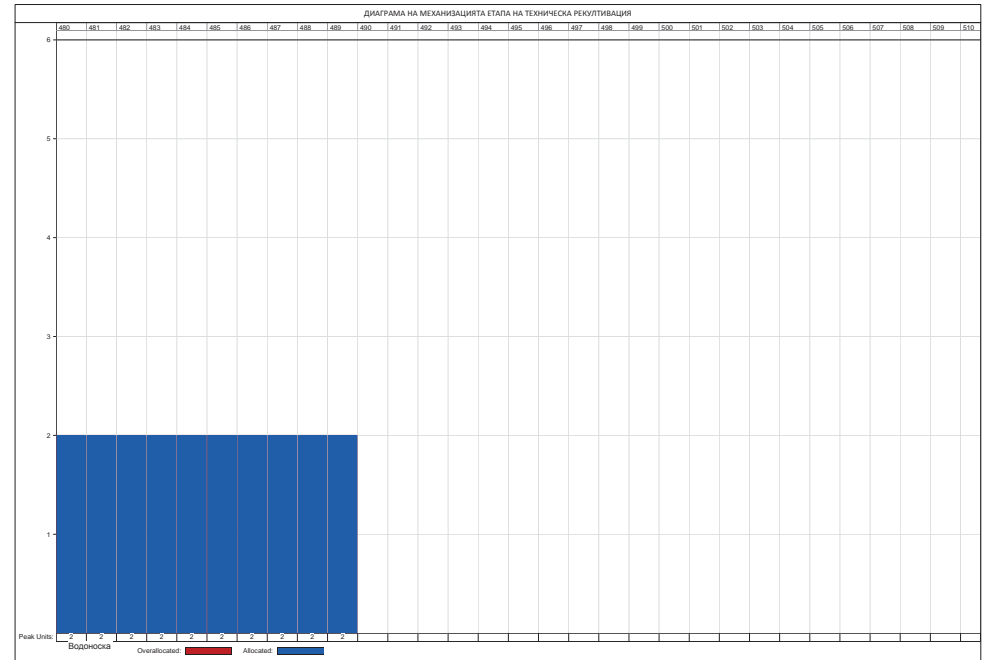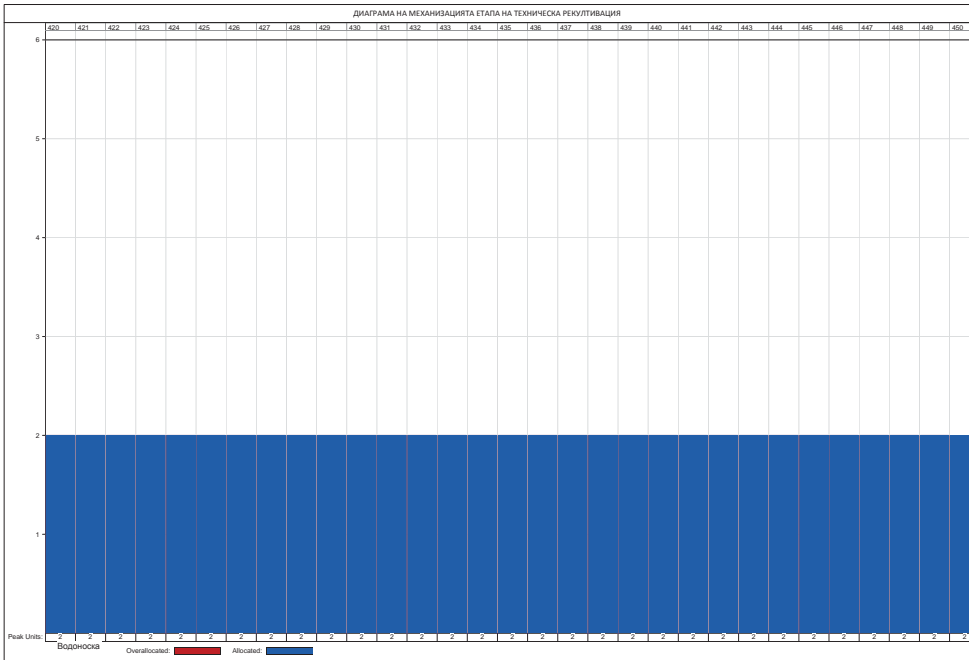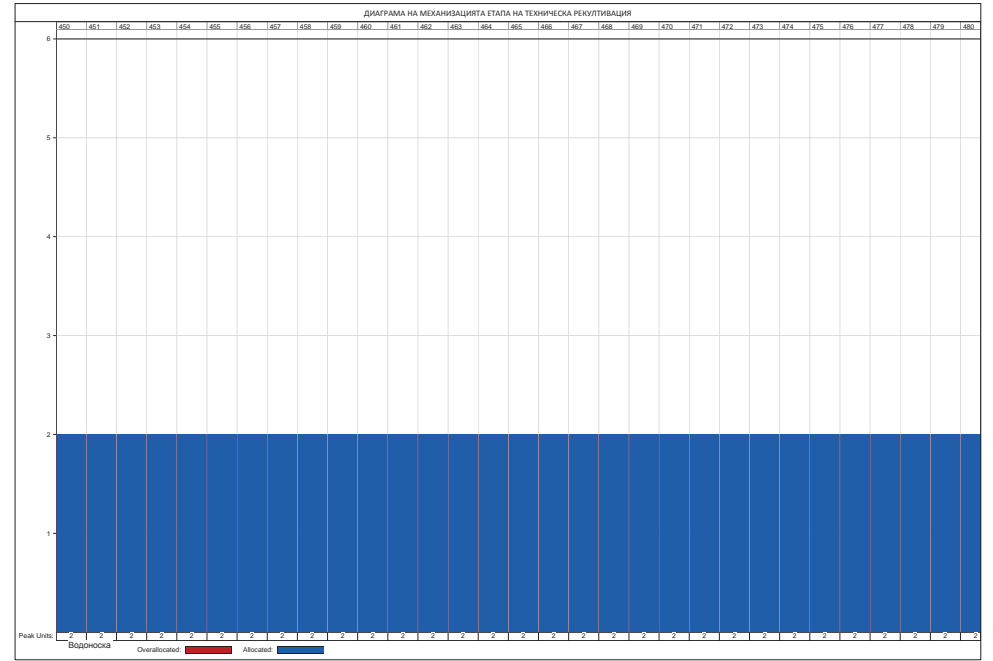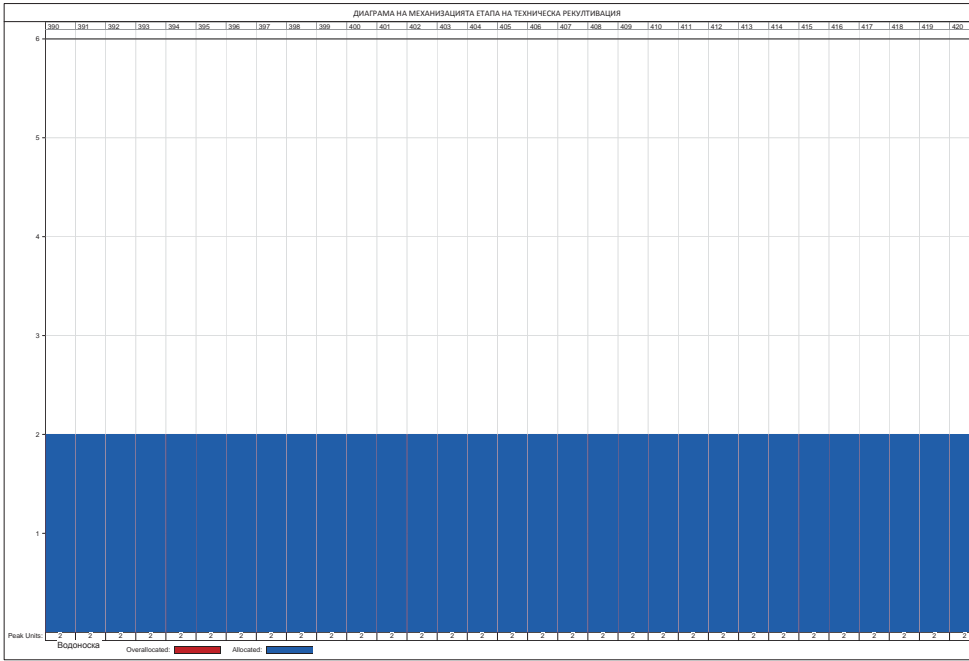

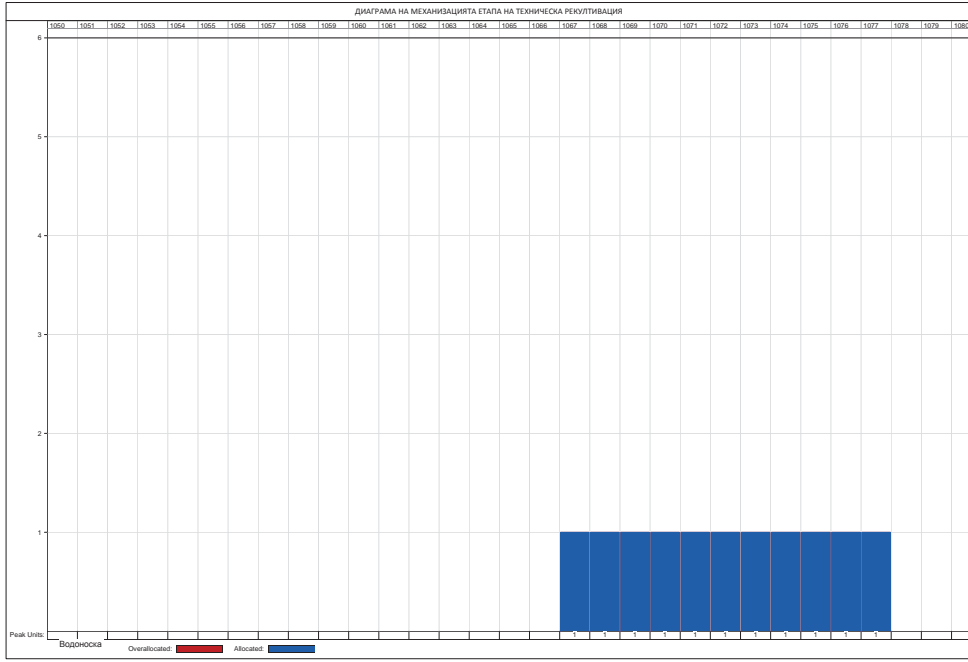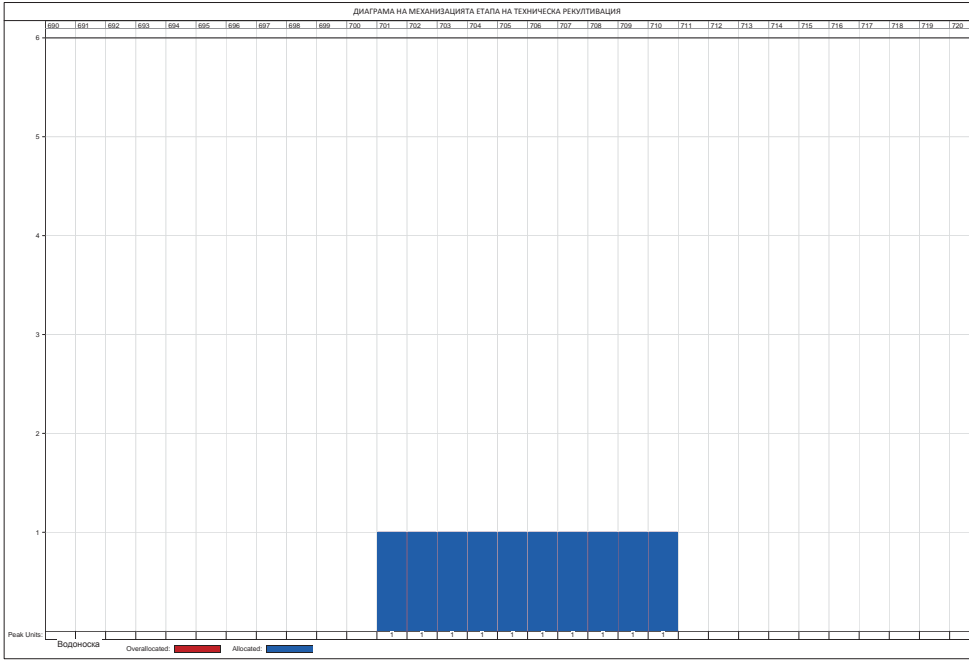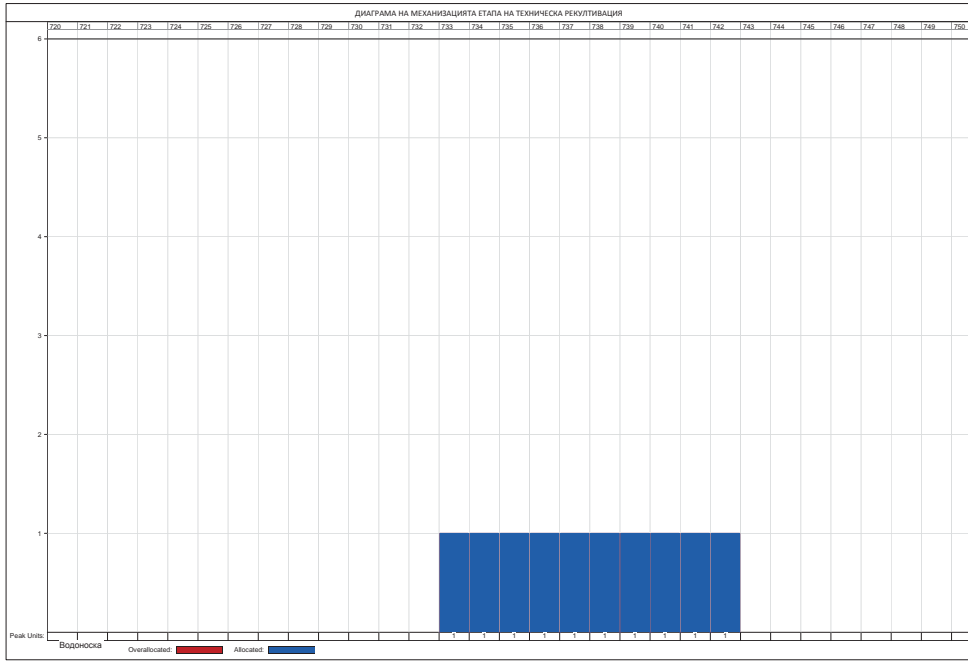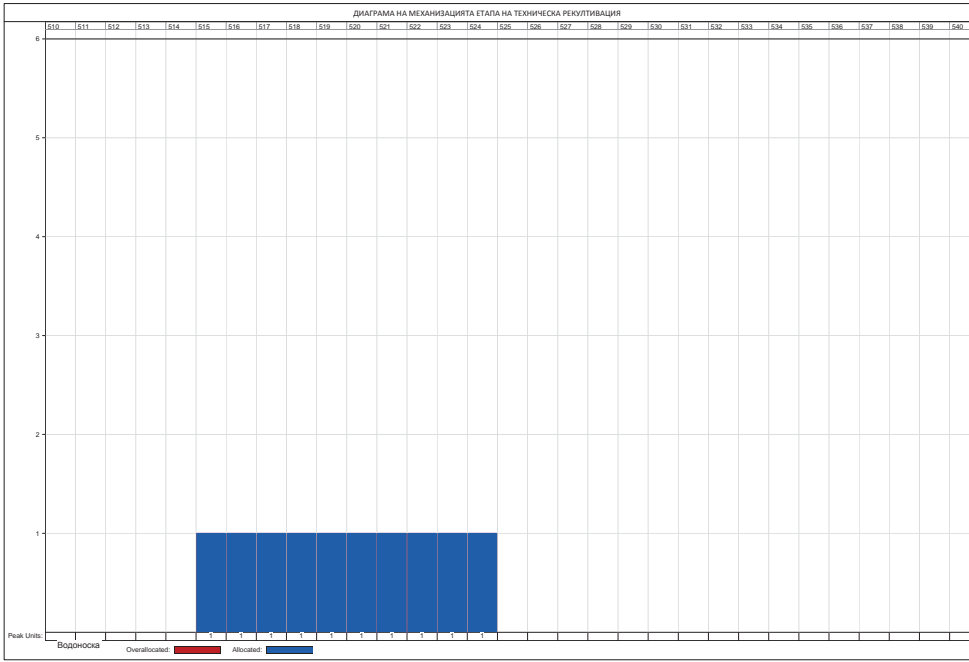

ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА ЕТАПА НА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ

